



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 340-01/16-01/10
URBROJ: 2140/01-02-16-2
Krapina, 1. ožujka 2016.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
- Izvješće o radu za 2015. godinu

Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13.–pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 1. ožujka 2016. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2015. godinu Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.
2. Prijedlog zaključka i Izvješće nalaze se u prilogu i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja zadužuje se Željko Vincelj, ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.

Ž U P A N
Željko Kolar

Dostaviti:

1. Županijska skupština,
2. Za Zbirku isprava,
3. Pismohrana.



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49218 Pregrada, Janka Leskovara 40/1

Izvješće o radu za 2015. godinu



U Pregradi, veljača 2016. godine

1. Opći dio

Temeljem Zakona o javnim cestama (NN 100/96) i Odluke Skupštine Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 1/97) Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije započela je s radom 01.01.1998. godine.

Županijska uprava za ceste temeljem važećeg Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te u okviru svoje djelatnosti obavlja sljedeće poslove:

- priprema izrade stručnih podloga za četverogodišnje programe građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- poslove građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta, odnosno:
 - pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija te njihovu stručnu ocjenu,
 - ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima, ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih objekata i prometne signalizacije,
 - ishodačenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je dopušteno građenje i uporaba građevine po posebnom propisu,
 - ustupanje radova izmještanja komunalne i druge infrastrukture,
 - ustupanje geodetskih radova,
 - ustupanje radova građenja i rekonstrukcije,
 - ustupanje usluga stručnog nadzora građenja,
 - organizaciju tehničkog pregleda i primopredaju javne ceste te dijelova javne ceste i objekata na korištenje i održavanje,
 - investitorski nadzor nad provođenjem projekata
 - ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima javna cesta mora udovoljiti u pogledu sigurnosti prometa
 - rješavanje imovinsko-pravnih odnosa potrebnih za građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta
- poslove održavanja županijskih i lokalnih cesta, odnosno:
 - planiranje održavanja i mjera zaštite javnih cesta i prometa na njima,
 - redovito i izvanredno održavanje javnih cesta,
 - ustupanje radova redovitog i izvanrednog održavanja javnih cesta,
 - stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja javnih cesta,
 - ustupanje usluga stručnog nadzora i kontrole kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja javnih cesta,
 - osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s javne ceste te ophodnju.
- ostale poslove upravljanja javnim cestama:
 - osiguranje obavješćivanja javnosti o stanju i prohodnosti javnih cesta, izvanrednim događajima na njima i o meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa,
 - vođenje podataka o javnim cestama,
 - priprema podloga za pripremu i dodjelu koncesija,
 - odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnim cestama,
 - praćenje i analiza stanja sigurnosti prometa na javnim cestama,
 - izrada izvješća, elaborata i sl. materijala za potrebe Ministarstva, Županijske skupštine i Župana.
- financiranje građenja, rekonstrukcije i održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- praćenje prometnog opterećenja i prometnih tokova na županijskim i lokalnim cestama,
- ostale djelatnosti sadržane u osnivačkom aktu.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i Uredbe o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (NN 34/12), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donio je Odluku o razvrstavanju javnih cesta u državne, županijske i lokalne (NN 66/15) kojom se javne ceste razvrstavaju u četiri skupine i to: autoceste, državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste.

Slijedom ranije navedene Odluke na području Krapinsko-zagorske županije ova Uprava upravlja sa:

406,70 km županijskih cesta
249,70 km lokalnih cesta
656,40 km UKUPNO

Temeljem Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i Rješenja o imenovanju četiri člana Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste KZZ od 22. srpnja 2013. godine, izdanim od Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije, imenovano je Upravno vijeće Županijske uprave za ceste KZZ, u sastavu: predsjednik Ivan Kranjčić, članovi: Žarko Broz, Tomislav Končevski, Željko Lisak te predstavnik radnika ŽUC-a Nevenka Dobrina. Sukladno Zakonskim propisima te Statutu ŽUC-a doneseni su svi potrebni akti i programi rada za normalno funkcioniranje uprave.

U okviru Županijske uprave za ceste ustrojene su organizacijske jedinice i to:

Odjel za održavanje i zaštitu županijskih i lokalnih cesta
Odjel za građenje i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta
Odjel za financijske, pravne i opće poslove

U Županijskoj upravi za ceste KZZ je zaposleno 10 djelatnika na neodređeno vrijeme i to 4 djelatnika sa VSS, 4 djelatnika sa VŠS i 2 djelatnika sa SSS. U tijeku godine primljena su dvije osobe na stručno osposobljavanje po programu HZZ.

Temeljem Zakona o cestama, Zakona o proračunu, Zakona o javnoj nabavi te ostalih zakonskih propisa koje je u okviru svog poslovanja obavezna primjenjivati, Županijska uprava za ceste je u 2015. godini zaprimila i obradila:

- 623 neupravnih akata i to:
 - 61 zahtjev za posebne uvjete građenja,
 - 82 mišljenja na projektnu dokumentaciju (uključujući i prethodne suglasnosti),
 - obavljani su mnogi tehnički pregledi objekata uz javne ceste,
 - postupalo se po 10 tužbi i odštetnih zahtjeva,
 - 541 predmeta koji se odnose na poslovanje Uprave, kao što su izvješća, elaborati i materijali s Ministarstvima, Županom, Županijskom skupštinom, jedinicama lokalne samouprave i ostalim Županijskim upravama za ceste,
 - donesene su odluke ravnatelja sukladno Statutu Županijske uprave za ceste KZZ i dr.


Županijska uprava za ceste kao izvanproračunski korisnik jedinice područne (regionalne) samouprave, između ostalih zakonskih propisa, obvezna je provoditi odredbe Zakona o javnoj nabavi, vezano na odredbu članka 33. Zakona o cestama, kojim je izvođenje radova građenja i rekonstrukcije, te radova održavanja javnih cesta, obvezna ustupiti pravnoj i fizičkoj osobi koja je za te radove registrirana, specijalizirana i opremljena, te koja raspolaže osposobljenim kadrovima za izvođenje radova i pod prometom, pa je slijedom istog u tijeku 2015. godine provela:

- 6 postupaka nabave roba, radova i usluga male vrijednosti
- 45 postupaka nabave roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti.

2. Prihodi i rashodi ostvareni u 2015. godini

2.1. Prihodi i primici ostvareni u 2015. godini


UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	38.167.510,78 kn
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.167.510,78 kn
PRIHODI POSLOVANJA	35.142.510,78 kn
Prihodi od financijske imovine	73.639,93 kn
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	73.639,93 kn
Prihodi od nefinancijske imovine	35.022.529,18 kn
Naknade za ceste	35.022.529,18 kn
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	46.341,67 kn
Ostali nspomenuti prihodi	46.341,67 kn
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.000,00 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	25.000,00 kn
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	25.000,00 kn
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	3.476.853,35 kn
Raspoloživa sredstva iz prethodne godine	3.476.853,35 kn
Višak prihoda	3.476.853,35 kn



Iz prikazane strukture vidljivo je da je 91% ukupno ostvarenih prihoda realizirano iz Općih prihoda i primitaka odnosno iz *Godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji cestovnih motornih vozila, Naknade za korištenje cestovnog zemljišta*, koje su izravni prihod Županijske uprave za ceste.

2.2. Rashodi i izdaci ostvareni u 2015. godini

UKUPNO RASHODI / IZDACI	34.138.876,64 kn
Program 1000 RASHODI UPRAVE	5.018.976,64 kn
Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE	28.096.161,74 kn
Aktivnost A100002 GRAD KRAPINA -čl.108 ZOC (NN-84/11)	1.386.909,15 kn
Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE	16.116.365,61 kn
Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE	10.592.8886,98 kn
Program 1002 OTPLATA KREDITA	1.023.738,26 kn



Iz prikazane strukture vidljivo je da je 82% ukupno izvršenih rashoda uloženo u osnovnu djelatnost Uprave, odnosno u redovito i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Županije.

3. Prikaz radova redovitog i izvanrednog održavanja

Temeljem ostvarenih prihoda i Plana radova redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta kojeg je donijelo Upravno vijeće, izvedeni su radovi redovitog i izvanrednog održavanja na županijskim i lokalnim cestama kako sijedi:

a) Izvedeni radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta

POZICIJA	RADOVI	PLANIRANO	REALIZACIJA
1.	RADOVI REDOVITOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	16.220.000,00 kn	16.116.365,61 kn

Radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2015. godini planirani su u ukupnom iznosu 16.220.000,00 kn, a realizirane su u ukupnoj vrijednosti 16.116.365,61 kn. Tim radovima obuhvaćene su sljedeće skupine radova:

1.1. Radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta kojim su obuhvaćeni radovi ljetnog i zimskog održavanja za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine - planirani su u ukupnom iznosu 14.920.000,00 kn, a izvedeni u vrijednosti 14.907.057,59 kn.

U tabličnom obliku prikazane su vrijednosti i udio u postocima pojedinih radova redovitog održavanja, odnosno u kojem su obimu pojedini radovi zastupljeni.

IZVEDENI RADOVI REDOVITOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA u razdoblju od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine

Tablica 1. Radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta u razdoblju 01.01.2015.-31.12.2015. godine

Broj stavke	Naziv i opis stavke	Vrijednost radova 01.01.2015.-31.12.2015.	Udio (%)
1.	NADZOR I PREGLED CESTA I OBJEKATA	172.127,25 kn	1,44%
2.	ODRŽAVANJE PROMETNIH POVRŠINA	134.824,76 kn	1,13%
3.	ASFALJNI KOLNICI	2.337.035,59 kn	19,60%
4.	BANKINE	656.470,43 kn	5,50%
5.	POKOSI	98.395,11 kn	0,83%
6.	ODVODNJA	2.129.993,84 kn	17,86%
7.	PROMETNA SIGNALIZACIJA I OPREMA	1.578.498,64 kn	13,24%
8.	CESTOVNE NAPRAVE I UREĐAJI	0,00 kn	0,00%
9.	VEGETACIJA	1.293.290,52 kn	10,84%
10.	OSIGURANJE PREGLEDNOSTI	37.128,96 kn	0,31%
11.	CESTOVNI OBJEKTI	177.876,26 kn	1,49%
12.	INTERVENTNI RADOVI	272.090,08 kn	2,28%
13.	ZIMSKA SLUŽBA	3.037.914,63 kn	25,47%
	UKUPNO:	11.925.646,07 kn	100%
	PDV 25%	2.981.411,52 kn	
	SVEUKUPNO:	14.907.057,59 kn	

1.2. Utrošak natrijevog klorida za potrebe održavanja županijskih i lokalnih cesta te objekata na području KZŽ za vrijeme zimske službe planiran je u iznosu 1.300.000,00 kn, a ukupno ga je utrošeno u iznosu od 1.209.308,02 kn (1.535,89 tona). Natrijev klorid za održavanja cesta i objekata u zimskim uvjetima nabavljaju Hrvatske ceste d.o.o., a prava i obaveze regulirane su temeljem Sporazuma između Hrvatskih cesta d.o.o. i ove Uprave.

Također je uz utrošen natrijev klorid ukupno utrošeno i 3.168,80 m³ posipnog materijala (kamene sitneži), vrijednosti 387.639,30 kn.

Tablica 3. Utrošak natrijevog klorida za potrebe održavanja cesta i objekata za vrijeme zimskih uvjeta

Broj stavke	Naziv i opis stavke	Vrijednost
13.17.	Natrijev klorid evidencijski - 1.535,89 tona	1.209.308,02 kn

b) Izvedeni radovi izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta

POZICIJA	RADOVI	PLAN RADOVA	REALIZACIJA
2.	PLANIRANI RADOVI IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	12.841.853,35 kn	10.592.886,98 kn

Radovi izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2015. godini planirani su u ukupnom iznosu od 12.841.853,35 kn, od tog iznosa 1.621.701,21 kn planiran je za završetak radova ugovorenih i započelih 2014. godine, a isti su uspješno dovršeni u cijelosti u 2015. godini. Vrijednost ukupno izvedenih radova iznosi 10.592.886,98 kn.

U niže navedenim tablicama prikazane su vrste radova izvanrednog održavanja i navedene županijske i lokalne ceste koje su bile obuhvaćene radovima tijekom 2015. godine:

2.1. Presvlačenje dionica županijskih i lokalnih cesta novim asfaltnim slojem - prema tablici 1., planirano je u ukupnom iznosu 2.067.000,00 kn, a realizirano je radova u vrijednosti od 2.065.836,46 kn. Programom presvlačenja obuhvaćeno je 9 dionica javnih cesta na kojima je ukupno ugrađeno 28.761,06 m² novog habajućeg asfaltnog sloja.

Tablica 1. Dionice županijskih i lokalnih cesta predviđene za presvlačenje novim asfaltnim slojem

Red. br.	Br. ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN RADOVA	REALIZACIJA
2.1.1.	2195	Gubaševo	Presvlačenje novim asfaltnim slojem	2.067.000,00 kn	2.065.836,46 kn
2.1.2.	22022	Donja Konjščina-Kosovečko	Presvlačenje novim asfaltnim slojem		
2.1.3.	2095	Klenovec Humski	Presvlačenje novim asfaltnim slojem		
2.1.4.	2219	Pila	Presvlačenje novim asfaltnim slojem		
2.1.5.	2161	Pustodol	Presvlačenje novim asfaltnim slojem		
2.1.6.	22095	Druškovec	Presvlačenje novim asfaltnim slojem		
2.1.7.	22031	Radakovo	Presvlačenje novim asfaltnim slojem		
2.1.8.	2215	Radakovo	Presvlačenje novim asfaltnim slojem		
2.1.9.	2215	Tomaševac	Presvlačenje novim asfaltnim slojem		
UKUPNE VRIJEDNOSTI:				2.067.000,00 kn	2.065.836,46 kn

2.2. Uređenje oborinske odvodnje uz županijske ceste planirano je u iznosu od 1.403.000,00 kn, a izvršeno u vrijednosti od 1.363.025,03 kn. Radovima na uređenju oborinske odvodnje obuhvaćeno je 9 dionica županijskih i lokalnih cesta navedenih u tablici 2., na kojima je postavljen cestovnog rubnjaka uz rub kolnika i izgradnjom zatvorenog sustava odvodnje na mjestu otvorenog cestovnog jarka, riješen problem odvodnje i kanaliziranja oborinskih voda.

Tablica 2. Uređenje oborinske odvodnje uz županijske i lokalne ceste

Red. br.	Br. ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN RADOVA	REALIZACIJA
2.2.1.	2216	Oroslavje	Uređenje oborinske odvodnje	1.403.000,00 kn	1.363.025,03 kn
2.2.2.	2217	Oroslavje	Uređenje oborinske odvodnje		
2.2.3.	2224	Samci	Uređenje oborinske odvodnje		
2.2.4.	2169	Belec	Uređenje oborinske odvodnje		
2.2.5.	2128	Lobor	Uređenje oborinske odvodnje		
2.2.6.	2160	Štručljevo	Uređenje oborinske odvodnje		
2.2.7.	22097	Veleškovec-Opasanjek	Uređenje oborinske odvodnje		
2.2.8.	2153	Pristava	Uređenje oborinske odvodnje		
2.2.9.	22029	Prosenik	Uređenje oborinske odvodnje		
UKUPNE VRIJEDNOSTI:				1.403.000,00 kn	1.363.025,03 kn

2.3. Radovi na rekonstrukciji i sanaciji županijskih i lokalnih cesta prikazani u tablici 3., obuhvaćaju dionice županijskih i lokalnih cesta na kojima su planirani radovi u vidu proširenja dionica, radovi na izradi potpornog zida te radovi na sanaciji makadamskih kolnika ukupne vrijednosti 4.846.700,00 kn, a realizirani u vrijednosti 3.053.103,06 kn.

Radovi na sanaciji i proširenju županijske ceste Ž2195 Veliko Trgovišće su realizirani i završeni tokom 2015. godine. Radovi su izvođeni temeljem Sporazuma o sanaciji obilaznih pravaca nakon završetka izvođenja radova na državnoj cesti D1 od strane Hrvatskih cesta d.o.o.. Navedenim sporazumom regulirano je sufinanciranje potrebnih radova od strane ove Uprave radi povećanja obima zahvata. Troškovi izvedenih radova biti će podmireni prema Hrvatskim cestama u 2016. godini nakon ispostave računa.

Tablica 3. Radovi na rekonstrukciji i sanaciji županijskih i lokalnih cesta

Red. br.	Br. ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN RADOVA	REALIZACIJA
2.3.1.	2151	Desinić	Radovi na sanaciji i proširenju ceste	535.500,00 kn	535.472,50 kn
2.3.2.	2201	Banšćica	Radovi na sanaciji i proširenju ceste	122.000,00 kn	121.967,19 kn
2.3.4.	2122	Radoboj	Radovi na sanaciji i proširenju ceste	140.000,00 kn	138.960,44 kn
2.3.5.	22099	Marija Bistrica	Radovi na sanaciji kolničke konstrukcije (faza II)	730.100,00 kn	730.017,50 kn
2.3.6.	22098	Sv.Matej-G.Planina	Radovi na sanaciji makadamskog zastora	106.000,00 kn	105.931,88 kn
2.3.7.	22091	Klenice-Bušin	Radovi na sanaciji makadamskog zastora	147.900,00 kn	147.818,46 kn
2.3.8.	2248	Jelenjak	Radovi na izradi drenaže Jelenjak	24.500,00 kn	24.423,75 kn
2.3.9.	2195	Klanječko Jezero-Veliko Trgovišće	Radovi na sanaciji i proširenju ceste-sufinanciranje	1.734.000,00 kn	0,00 kn
2.3.10.	2195	Veliko Trgovišće	Radovi na sanaciji oborinske odvodnje	87.000,00 kn	39.912,50 kn
2.3.11.	2151	Desinić	Sanacija potpornog zida	78.200,00 kn	71.704,38 kn
2.3.12.	2128	Lobor	Korekcija poprečnih padova kolnika	224.000,00 kn	223.885,81 kn
2.3.13.	više ŽC i LC		Pokazivači brzine	237.500,00 kn	237.500,00 kn
2.3.14.	više ŽC i LC		Sanacija asfaltom oštećenja na kolniku	584.000,00 kn	583.758,69 kn
2.3.14.	više ŽC i LC		Radovi na iskolčenju infrastrukture (HT, HEP, plin i sl.) u cestovnom zemljištu, kontrolna ispitivanja i dr.	8.500,00 kn	0,00 kn
2.3.16.	više ŽC i LC		Sanacija ispuha	87.500,00 kn	83.075,98 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:				4.846.700,00 kn	3.044.429,08 kn

2.4. Radovi na sanaciji propusta prikazani u tablici 4., obuhvaćaju radove na sanaciji propusta u mjestu Sveti Križ na lokalnoj cesti L22022. Predmetni radovi planirani su u ukupnom iznosu od 93.700,00 kn, a nakon uspješno izvedenih radova okončana situacija je iznosila 93.636,98 kn.

Tablica 4. Radovi na sanaciji propusta

Red. br.	Br. ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN RADOVA	REALIZACIJA
2.4.2.	22022	Sveti Križ-Budinščina	Radovi na sanaciji propusta	93.700,00 kn	93.636,98 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:				93.700,00 kn	93.636,98 kn

2.5. Radovi na sanaciji klizišta na županijskim i lokalnim cestama navedeni u tablici 5., planirani su ukupnom iznosu od 1.493.452,14 kn, a realizirani u iznosu od 1.472.383,22 kn.

Programom sanacije klizišta na županijskim i lokalnim obuhvaćeno je 5 različitih lokacija na županijskim i lokalnim cestama. Svi radovi na sanaciji klizišta na navedenim lokacijama su uspješno izvedeni,

Tablica 5. Radovi na sanaciji klizišta na županijskim i lokalnim cestama

Red. br.	Br. ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN RADOVA	REALIZACIJA
2.5.5.	2171	Hrašćina 4-d2-St.0+450km-0+540km	Radovi na sanaciji klizišta	422.100,00 kn	422.001,05 kn
2.5.7.	2155	Hršak Breg 2-d3-St.3+800km-3+900km	Radovi na sanaciji klizišta	376.852,14 kn	356.076,06 kn
2.5.9.	22014	Bregi Radobojski-d1-kbr 115	Radovi na sanaciji klizišta	185.100,00 kn	185.057,14 kn
2.5.10.	22088	Bregi Radobojski-d1-St.1+100km	Radovi na sanaciji klizišta	124.400,00 kn	124.390,78 kn
2.5.11.	2158	Sveti Križ Z.-d2-St.0+140km-0+230km	Radovi na sanaciji klizišta	385.000,00 kn	384.858,19 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:				1.493.452,14 kn	1.472.383,22 kn

2.6. Izrada projektne dokumentacije za radove izvanrednog održavanja planirana je u vrijednosti od 1.291.300,00 kn, a realizirana u vrijednosti 906.875,00 kn. Izradom projektne dokumentacije obuhvaćena je potrebna dokumentacija za sanaciju klizišta na županijskim i lokalnim cestama, te dokumentacija za radove na sanaciji pojedinih kritičnih dionica županijskih ili lokalnih cesta.

Izrađena projektna dokumentacija navedena je u tablici 6.

Prema toj tablici vidljivo je da projekt izvanrednog održavanja L22016 Lobor-Stari Golubovec i projekt oborinske odvodnje uz Ž2158 Donja Pačetina nisu realizirani, budući da su ugovoreni krajem 2015. godine, te je krajnji rok za završetak projektne dokumentacije 15.05.2016. godine.

Tablica 6. Izrada projektne dokumentacije za radove izvanrednog održavanja

Red. br.	Br. ceste	Naziv dionice / naziv objekta / naziv klizišta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN RADOVA	REALIZACIJA
2.6.1.	2155	Tuheljske T.-d1-St.1+250km-1+350km	Projekt sanacije klizišta	50.000,00 kn	50.000,00 kn
2.6.2.	22010	Donje Jesenje 2,3,4	Projekt sanacije klizišta	116.900,00 kn	116.875,00 kn
2.6.3.	2155	Klokovec 3	Projekt sanacije klizišta	50.000,00 kn	50.000,00 kn
2.6.4.	2158	Sveti Križ Z.-d2-St.0+140km-0+230km	Projekt sanacije klizišta	32.500,00 kn	32.500,00 kn
2.6.5.	22004	Poljana Sutl.-1-St.2+150km-2+200km	Elaborat sanacije klizišta	22.500,00 kn	22.500,00 kn
2.6.6.	2169	Završje Bel.-d4-St.3+772km-3+922km	Dopuna elaborata sanacije klizišta	40.000,00 kn	40.000,00 kn

Red. br.	Br. ceste	Naziv dionice / naziv objekta / naziv klizišta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN RADOVA	REALIZACIJA
2.6.7.	2172	Trgovišće-Dom.-d1-St.0+100km-0+500	Dopuna elaborata sanacije klizišta	40.000,00 kn	40.000,00 kn
2.6.8.	22029	Dugnjevce 2-d1-St.2+250km-2+500km	Dopuna elaborata sanacije klizišta	40.000,00 kn	40.000,00 kn
2.6.9.	2155	Hršak Breg 2-d3-St.3+800km-3+900km	Dopuna elaborata sanacije klizišta	40.000,00 kn	40.000,00 kn
2.6.10.	2151	Vrhi Vinag.-d3.St.580km-3+250km	Projekt izvanrednog održavanja i klizišta	98.200,00 kn	98.125,00 kn
2.6.11.	2126	Gregurovec 2	Projekt izvanrednog održavanja i klizišta	93.200,00 kn	93.125,00 kn
2.6.12.	22016	Lobor-Stari Golubovec	Projekt izvanrednog održavanja	95.000,00 kn	0,00 kn
2.6.13.	2117	Stipernica	Projekt izvanrednog održavanja	41.300,00 kn	41.250,00 kn
2.6.17.	2158	Donja Pačetina	Projekt oborinske odvodnje	132.000,00 kn	0,00 kn
2.6.19.	22015	Veternica	Projekt sanacije klizišta	43.200,00 kn	43.125,00 kn
2.6.20.	22007	Vinagora	Novelacija projektne dokumentacije	24.400,00 kn	24.375,00 kn
2.6.21.	2128	Završje Loborsko	Projekt sanacije i proširenja ceste	111.900,00 kn	37.500,00 kn
2.6.22.	2171,2172	Trgovišće	Projekt kružnog toka	53.800,00 kn	17.500,00 kn
2.6.23.	2198	Donja Stubica	Projekt sanacije ŽCP	68.800,00 kn	23.125,00 kn
2.6.27.	2200	Vukšinec	Projekt sanacije klizišta	22.500,00 kn	22.500,00 kn
2.6.31.	2195	Veliko Trgovišće	Dopuna projektne dokumentacije	10.000,00 kn	10.000,00 kn
2.6.32.	2126	Gregurovec	Dopuna projektne dokumentacije	9.400,00 kn	9.375,00 kn
2.6.33.	2151	Vrh Vinagorski	Dopuna projektne dokumentacije	8.200,00 kn	8.125,00 kn
2.6.34.	2169	Završje Belečko	Sanacijski program klizišta	25.000,00 kn	24.375,00 kn
2.6.35.	2127	Gora Veternička	Elaborat sanacije klizišta	22.500,00 kn	22.500,00 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:				1.291.300,00 kn	906.875,00 kn

2.7. U 2015. godini, sukladno zakonskim propisima, korištene su **usluge stručnog nadzora za radove izvanrednog održavanja** prema niže navedenoj tablici 7. Stručni nadzor radova izvanrednog održavanja planiran je u vrijednosti 25.000,00 kn i realiziran u istom iznosu.

Tablica 7. Stručni nadzor radova izvanrednog održavanja

Red. br.	Br. ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN RADOVA	REALIZACIJA
2.7.1.	22099	Marija Bistrica	Stručni nadzor na sanaciji kolničke konstrukcije	25.000,00 kn	25.000,00 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:				25.000,00 kn	25.000,00 kn

2.8. **Radovi izvanrednog održavanja prema ugovorima iz 2014. godine** prikazani su u niže navedenoj tablici 8.

Ukupna vrijednost radova po završetku realizacije iznosi 1.621.701,21 kn. Tim radovima uspješno su okončani radovi započeti krajem 2014. godine.

Tablica 8. Izvršenje radova po ugovorima iz 2014. godine

Red. br.	Br. ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	Izvršeni radovi po ugovorima 2014. god
1.3.8.	više ŽC i LC	više dionica	Radovi na sanaciji poklopaca RO i odvodnje	271.302,10 kn
2.3.3.	2257	Radoboj	Radovi na sanaciji i proširenju ceste (faza I)	503.782,42 kn
2.3.6.	22098	Sv.Matej-Gornja Planina	Radovi na sanaciji makadamskog zastora	82.198,00 kn
2.4.13.	2215	Radakovo	Radovi na sanaciji klizišta	115.562,00 kn
2.4.19.	2155	Hršak Breg	Radovi na sanaciji klizišta	97.856,69 kn
2.5.4.	2151	Vrhi Vinagorski	Projekt rekonstrukcije ceste i sanacije klizišta	246.000,00 kn
2.5.33.	2126	Gregurovec	Projekt rekonstrukcije ceste i sanacije klizišta	230.000,00 kn
2.5.34.	22040	Krapinske Toplice	Projekt sanacije klizišta i oborinske odvodnje	60.000,00 kn
2.6.4.	2257	Radoboj	Stručni nadzor radova na sanac. i proš. ceste (faza I)	15.000,00 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:				1.621.701,21 kn


POZICIJA	RADOVI	PLAN RADOVA	REALIZACIJA
3.	GRAD KRAPINA - FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.420.000,00 kn	1.386.909,15 kn

3.1. Županijskoj upravi za ceste KŽŽ, temeljem Odluke o razvrstavanju javnih cesta (NN 44/12) i Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (NN 44/12) određena je prekategorijska ukupno 28,79 km županijskih i lokalnih cesta u nerazvrstane ceste na području grada Krapine. Održavanje tih cesta vrši se sredstvima iz proračuna grada Krapine i sufinancira od strane Županijske uprave za ceste, temeljem članka 108. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14)). Tijekom 2015. godine Županijska uprava za ceste je sufinancirala održavanje navedenih cesta u ukupnom iznosu od 1.386.909,15 kn.

**REKAPITULACIJA UKUPNO IZVEDENIH RADOVA REDOVITOG I
IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
u razdoblju od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine**

Redni broj	Opis radova	PLAN RADOVA	REALIZACIJA
1.	Planirani radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta	16.220.000,00 kn	16.116.365,61 kn
2.	Planirani radovi izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta	11.220.152,14 kn	8.971.185,77 kn
3.	Radovi izvanrednog održavanja prema ugovorima iz 2014. godine	1.621.701,21 kn	1.621.701,21 kn
4.	Grad Krapina-financiranje nerazvrstanih cesta	1.420.000,00 kn	1.386.909,15 kn
UKUPNO PLANIRANI RADOVI REDOVITOG I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ZA 2015. GODINU:		30.481.853,35 kn	28.096.161,74 kn

Ravnatelj
Željko Vincelj dipl.oec.




Klasa: 023-01/16-01/02
Urbroj: 2140-12-03/2-16-1
Pregrada: 18.02.2016.

PRILOG

**PRIKAZ DULJINA KOLNIKA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
RASPODIJELJENIH PO GRADOVIMA I OPĆINAMA**

Grad/Općina	Duljina županijskih cesta	Duljina lokanih cesta	Duljina cesta ukupno
GRAD DONJA STUBICA	12,47	6,39	18,86
GRAD KLANJEC	10,22	9,35	19,57
GRAD OROSLAVJE	12,29	5,77	18,06
GRAD PREGRADA	31,10	6,89	37,99
GRAD ZABOK	16,45	4,99	21,45
GRAD ZLATAR	25,11	19,51	44,62
OPĆINA BEDEKOVČINA	30,36	1,66	32,02
OPĆINA BUDIŠČINA	10,69	7,70	18,39
OPĆINA DESINIĆ	20,46	8,45	28,91
OPĆINA ĐURMANEC	5,66	12,13	17,79
OPĆINA GORNJA STUBICA	21,65	8,28	29,93
OPĆINA HRAŠČINA	9,37	11,33	20,70
OPĆINA HUM NA SUTLI	8,60	6,91	15,51
OPĆINA JESENJE	0,00	5,82	5,82
OPĆINA KONJŠČINA	13,38	20,40	33,78
OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI	14,94	7,13	22,07
OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE	14,69	19,45	34,14
OPĆINA KUMROVEC	6,61	5,66	12,27
OPĆINA LOBOR	9,83	6,36	16,19
OPĆINA MAČE	8,28	2,21	10,49
OPĆINA MARIJA BISTRICA	19,10	8,06	27,16
OPĆINA MIHOVLJAN	11,77	1,52	13,29
OPĆINA NOVI GOLUBOVEC	4,64	2,42	7,06
OPĆINA PETROVSKO	6,83	1,66	8,49
OPĆINA RADOBOJ	14,55	9,43	23,98
OPĆINA STUBIČKE TOPLICE	17,59	0,00	17,59
OPĆINA SV. KRIŽ ZAČRETJE	20,96	2,26	23,22
OPĆINA TUHELJ	10,36	7,01	17,37
OPĆINA VELIKO TRGOVIŠČE	16,27	24,95	41,22
OPĆINA ZAGORSKA SELA	2,47	6,20	8,66
OPĆINA ZLATAR BISTRICA	0,00	9,82	9,82
Ukupno km	406,70	249,70	656,40

Duljina kolnika županijskih i lokanih cesta po gradovima i općinama

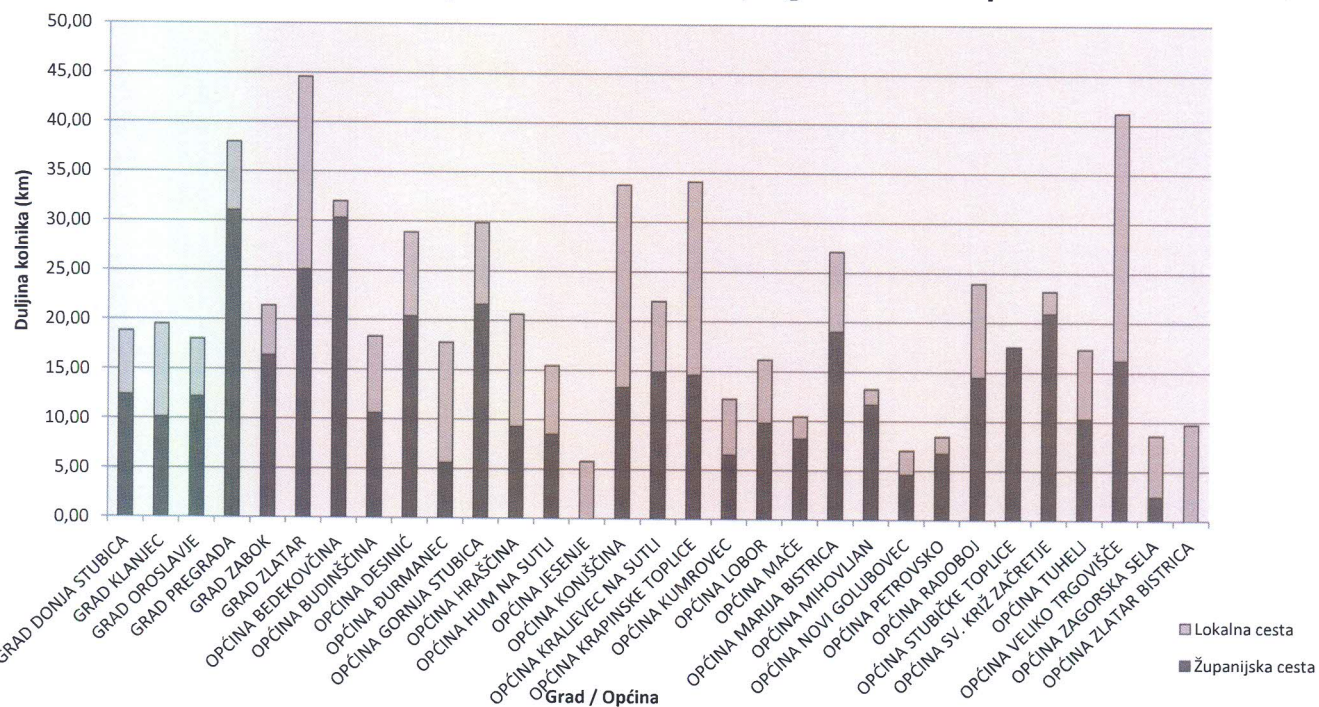



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

KLASA: 340-01/16-01/10

URBROJ: 2140/01-01-16-3

Krapina, __. ožujka 2016.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije** na 18. sjednici održanoj dana __. ožujka 2016. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o prihvatanju Izvješća o radu za 2015. godinu
Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije

- I. Prihvaća se Izvješće o radu za 2015. godinu Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.
- II. Izvješće iz toč. I. ovog Zaključka nalazi se u prilogu i čini njegov sastavni dio.

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr. vet. med.

Dostaviti:

1. Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije,
n/p ravnatelja, Pregrada, J. Leskovara 40/1,
2. «Službeni glasnik KZZ», za objavu,
3. za prilog zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.
