



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 340-01/20-01/09
URBROJ: 2140/01-02-20-3
Krapina, 19. ožujka 2020.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
- Izvješće o radu za 2019. godinu

Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13.–pročišćeni tekst i 13/18.)), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 19. ožujka 2020. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvatanju Izvješća o radu za 2019. godinu Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.
2. Prijedlog zaključka i Izvješće nalaze se u prilogu i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja zadužuje se Stjepan Sirovec, ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

1. Županijska skupština,
2. Za Zbirku isprava,
3. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,
turizam, promet i komunalnu infrastrukturu

KLASA: 340-01/20-01/09

URBROJ: 2140/1-06-20-02

Krapina, 19. ožujka 2020.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
- Izvješće o radu za 2019. godinu; obrazloženje

PRAVNI TEMELJ: Članak 32. i 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18. i 5/20).

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu – Županu, Župan – Županijskoj skupštini

IZVJESTITELJ: mr. Sanja Mihovilić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu – Županu, Stjepan Sirovec, ravnatelj ŽUC-a KZZ – Županijskoj skupštini

OBRAZLOŽENJE: Člankom 50. stavkom 3. Statuta Krapinsko-zagorske županije propisano je da su ustanove dužne putem svojih nadležnih tijela izvještavati jednom godišnje Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju.

Slijedom toga, Ravnatelj ŽUC-a KZZ je dana 18. ožujka 2020. godine dostavio Izvješće o radu za 2019. godinu. Priloženo, dostavlja se navedeno Izvješće.

Zakonski predstavnik ustanove ŽUC KZZ će usmeno na sjednici Skupštine dodatno pojasniti Izvješće o radu za 2019. godinu.

Temeljem iznijetog, predlaže se Županu da donese Prijedlog zaključka o prihvatanju Izvješća o radu Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu u tekstu kao u prilogu i sve naprijed pobrojane akte proslijedi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

POTREBNA FINACIJSKA SREDSTVA: Za razmatranje i usvajanje Izvješća o radu ŽUC-a KZZ nisu potrebna financijska sredstva.

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić

PRILOG:

- Izvješće o radu za 2019. g.
- Prijedlog zaključka Župana,
- Prijedlog zaključka Županijske skupštine



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

48218 Pregrada, Janka Leskovara 40/1

Primljeno: 18.03.2020.

Klasifikacijska oznaka:	Ust. jed.	
340-01/20-01/09		
Urudžbeni broj:	Pril.	Vrij.
2140-12-20-01		

Izvješće o radu za 2019. godinu



U Pregradi, ožujak 2020. godine

1. Opći dio

Temeljem Zakona o javnim cestama (NN 100/96) i Odluke Skupštine Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 1/97) Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije započela je s radom 01.01.1998. godine.

Županijska uprava za ceste temeljem važećeg Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te u okviru svoje djelatnosti obavlja sljedeće poslove:

- priprema izrade stručnih podloga za četverogodišnje programe građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- poslove građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta, odnosno:
 - pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija te njihovu stručnu ocjenu,
 - ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima, ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih objekata i prometne signalizacije,
 - ishodaenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je dopušteno građenje i uporaba građevine po posebnom propisu,
 - ustupanje radova izmještanja komunalne i druge infrastrukture,
 - ustupanje geodetskih radova,
 - ustupanje radova građenja i rekonstrukcije,
 - ustupanje usluga stručnog nadzora građenja,
 - organizaciju tehničkog pregleda i primopredaju javne ceste te dijelova javne ceste i objekata na korištenje i održavanje,
 - investitorski nadzor nad provođenjem projekata
 - ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima javna cesta mora udovoljiti u pogledu sigurnosti prometa
 - rješavanje imovinsko-pravnih odnosa potrebnih za građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta
- poslove održavanja županijskih i lokalnih cesta, odnosno:
 - planiranje održavanja i mjera zaštite javnih cesta i prometa na njima,
 - redovito i izvanredno održavanje javnih cesta,
 - ustupanje radova redovitog i izvanrednog održavanja javnih cesta,
 - stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja javnih cesta,
 - ustupanje usluga stručnog nadzora i kontrole kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja javnih cesta,
 - osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s javne ceste te ophodnju.
- ostale poslove upravljanja javnim cestama:
 - osiguranje obavješćivanja javnosti o stanju i prohodnosti javnih cesta, izvanrednim događajima na njima i o meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa,
 - vođenje podataka o javnim cestama,
 - priprema podloga za pripremu i dodjelu koncesija,
 - odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnim cestama,
 - praćenje i analiza stanja sigurnosti prometa na javnim cestama,
 - izrada izvješća, elaborata i sl. materijala za potrebe Ministarstva, Županijske skupštine i Župana.
- financiranje građenja, rekonstrukcije i održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- praćenje prometnog opterećenja i prometnih tokova na županijskim i lokalnim cestama,
- ostale djelatnosti sadržane u osnivačkom aktu.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o cestama NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i Uredbe o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (NN 34/12), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donio je Odluku o razvrstavanju javnih cesta u državne, županijske i lokalne (NN 103/18) kojom se javne ceste razvrstavaju u četiri skupine i to: autoceste, državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste.

Slijedom ranije navedene Odluke na području Krapinsko-zagorske županije ova Uprava upravlja sa:

414,43 km županijskih cesta
247,36 km lokalnih cesta
661,79 km UKUPNO

Temeljem Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i Rješenjem o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste KZŽ od 05. listopada 2017. godine, izdanim od Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije članovi Upravnog vijeća imenovani su kako slijedi: Nikola Boromisa predsjednik, članovi Tomislav Končevski, Josip Kovačić, Ivan Maligec, te predstavnik radnika ŽUC-a.

Sukladno Zakonskim propisima te Statutu ŽUC-a doneseni su svi potrebni akti i programi rada za normalno funkcioniranje uprave.

U okviru Županijske uprave za ceste ustrojene su organizacijske jedinice i to:

Odjel za poslove održavanje i zaštitu županijskih i lokalnih cesta
Odjel za poslove građenje i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta
Odjel za financijske, pravne i opće poslove

U Županijskoj upravi za ceste KZŽ u protekloj godini bilo je zaposleno 9 djelatnika na neodređeno vrijeme i to 3 djelatnika sa VSS, 4 djelatnika sa VŠS, 2 djelatnika sa SSS.

Temeljem Zakona o cestama, Zakona o proračunu, Zakona o javnoj nabavi te ostalih zakonskih propisa koje je u okviru svog poslovanja obavezna primjenjivati, Županijska uprava za ceste je u 2019. godini zaprimila i obradila:

- 1039 neupravnih akata i to:
 - 97 zahtjeva za posebne uvjete građenja,
 - 61 mišljenja na projektnu dokumentaciju
 - 27 prethodnih suglasnosti
 - obavljani su mnogi tehnički pregledi objekata uz javne ceste,
 - postupalo se po 6 tužbi i odštetnih zahtjeva,
 - 247 predmeta koji se odnose na utvrđivanje granica katastarskih čestica kojima upravlja ŽUC
 - 607 predmeta koji se odnose na poslovanje Uprave, kao što su izrada projektne dokumentacije, nadzor redovitog i izvanrednog održavanja ŽC i LC, izvješća, elaborati i materijali s Ministarstvima, Županom, Županijskom skupštinom, jedinicama lokalne samouprave i ostalim Županijskim upravama za ceste,
 - donesene su odluke ravnatelja sukladno Statutu Županijske uprave za ceste KZŽ i dr.


Županijska uprava za ceste kao izvanproračunski korisnik jedinice područne (regionalne) samouprave, između ostalih zakonskih propisa, obvezna je provoditi odredbe Zakona o javnoj nabavi, vezano na odredbu članka 33. Zakona o cestama, kojim je izvođenje radova građenja i rekonstrukcije, te radova održavanja javnih cesta, obvezna ustupiti pravnoj i fizičkoj osobi koja je za te radove registrirana, specijalizirana i opremljena, te koja raspolaže osposobljenim kadrovima za izvođenje radova i pod prometom, pa je slijedom istog u tijeku 2018. godine provela:

- 12 postupaka nabave roba, radova i usluga male vrijednosti
- 37 postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga

2. PRIHODI I PRIMICI I RASHODI I IZDACI OSTVARENI U 2019. GODINI

2.1. Prihodi i primici ostvareni u 2019. godini


UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	43.564.019,68 kn
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.198.907,82 kn
Prihodi od financijske imovine	53.215,08 kn
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	53.215,08 kn
Prihodi od nefinancijske imovine	38.122.772,74 kn
Naknade za ceste	38.122.772,74 kn
Prihodi po posebnim propisima	22.920,00 kn
Prihodi s naslova osiguranja, refundacija šteta i sl.	22.920,00 kn
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.168,42 kn
Ostali prihodi za posebne namjene-Grad Zabok izvlaštenje nekretnina	20.168,42 kn
Izvor POMOĆI	5.344.943,44 kn
Tekuće pomoći iz državnog proračuna	825.000,00 kn
Tekuće pomoći iz županijskog proračuna - HV	1.319.943,44 kn
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika DP (Hrvatske ceste)	3.200.000,00 kn
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	7.115.726,32 kn
Raspoloživa sredstva iz prethodne godine	7.115.726,32 kn
Višak prihoda	7.115.726,32 kn

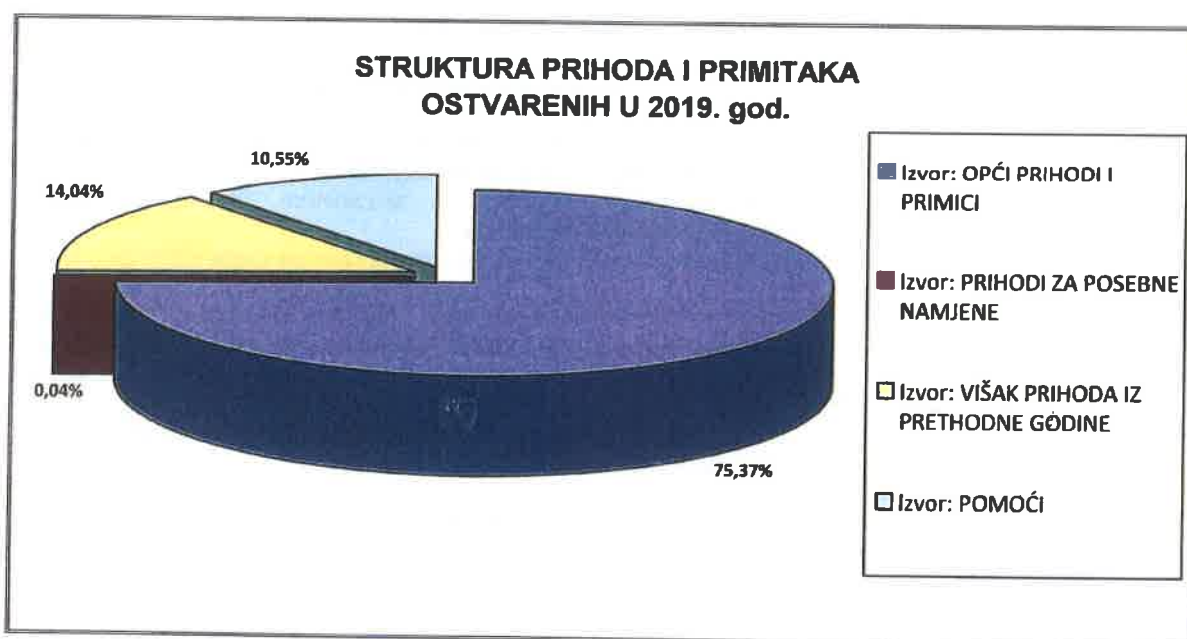

Iz prikazane strukture vidljivo je da je 83,32 % ukupno ostvarenih prihoda i primitaka realizirano iz Općih prihoda i primitaka odnosno iz Godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji cestovnih motornih vozila i Naknade za korištenje cestovnog zemljišta, koje su izravni prihod Županijske uprave za ceste. U ukupnoj strukturi prihoda ostale vrste prihoda čine manji dio, a ovisne su o strankama o postupku.

2.2. Rashodi i izdaci ostvareni u 2019. godini

UKUPNO RASHODI / IZDACI	44.160.115,90 kn
Program 1000 RASHODI UPRAVE	4.582.781,43 kn
Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE	37.097.054,31 kn
Aktivnost A100002 GRAD KRAPINA -čl.108 ZOC (NN-84/11)	1.588.338,87 kn
Aktivnost A100005 SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA	1.108.623,90 kn
Kapitalni projekt K100014 REKONSTRUKCIJA CESTA	5.608.193,60 kn
Kapitalni projekt K100016 SANACIJA KLIZIŠTA	3.364.632,68 kn
Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE	24.815.440,26 kn
Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE	611.825,00 kn
Program 1002 OTPLATA KREDITA	2.480.280,16 kn

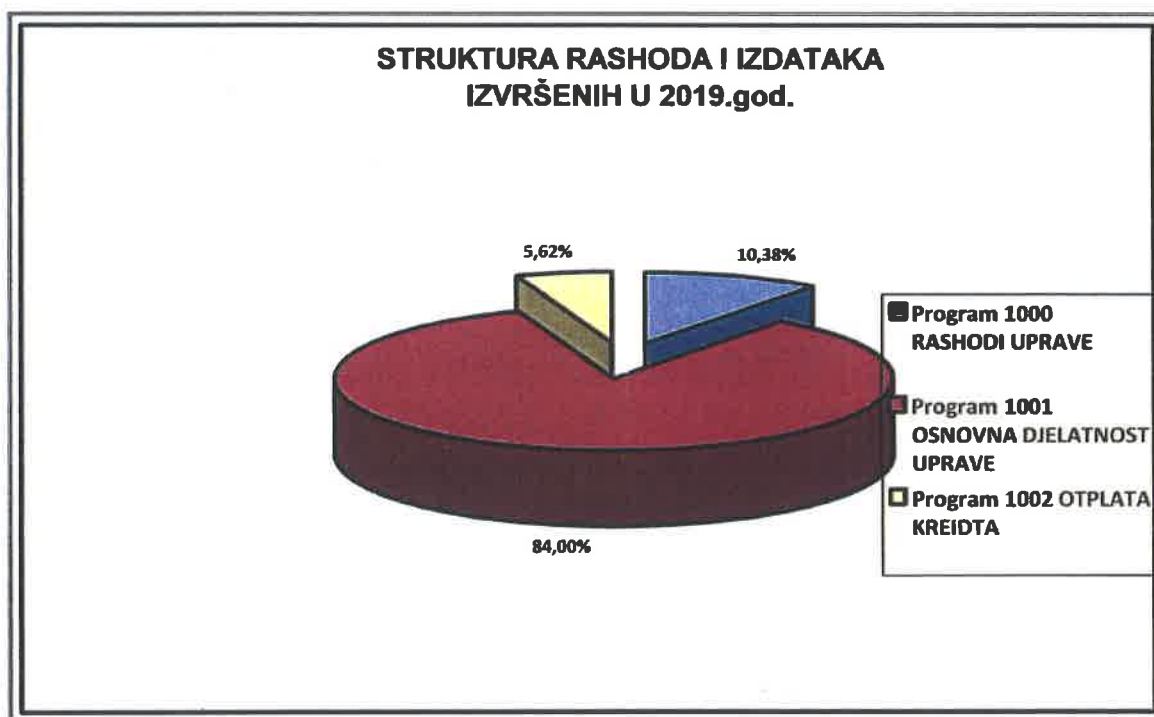

Iz prikazane strukture vidljivo je da je 84,00 % ukupno izvršenih rashoda uloženo u osnovnu djelatnost Uprave, odnosno u redovito i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Županije.

3. Prikaz radova redovitog i izvanrednog održavanja

Temeljem ostvarenih prihoda i Plana radova redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta kojeg je donijelo Upravno vijeće, izvedeni su radovi redovitog i izvanrednog održavanja na županijskim i lokalnim cestama kako sijedi:

a) Izvedeni radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta

POZICIJA	RADOVI	PLANIRANO	REALIZACIJA
1.	RADOVI REDOVITOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	26.719.067,45 kn	24.775.590,26 kn

Radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2019. godini planirani su u ukupnom iznosu 26.719.067,45 kn, a realizirani su u ukupnoj vrijednosti 24.775.590,26 kn. Tim radovima obuhvaćene su slijedeće skupine radova:

1.1. Radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta, kojim su obuhvaćeni radovi ljetnog i zimskog održavanja za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine - planirani su u ukupnom iznosu 17.239.067,45 kn, a izvedeni u vrijednosti 16.200.586,88 kn. Predmetni radovi su realizirani temeljem dva ugovora sklopljena temeljem okvirnog sporazuma. Prvi ugovor realiziran je u razdoblju od 01.01.2019. do 10.12.2019. godine u iznosu 14.336.904,35 kn, a drugi ugovor realiziran je dijelom u razdoblju od 11.12.2019. godine do 31.12.2019. godine u iznosu 1.863.682,54 kn.

U tabličnom obliku prikazane su ukupne vrijednosti i udio u postocima pojedinih radova redovitog održavanja, odnosno u kojem su obimu pojedini radovi zastupljeni.

**IZVEDENI RADOVI REDOVITOG ODRŽAVANJA
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
u razdoblju od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine**

Tablica 1. Radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta u razdoblju 01.01.2019.-31.12.2019. godine

Broj stavke	Naziv i opis stavke	01.01.2019.- 10.12.2019.	11.12.2019.- 31.12.2019.	Ukupno	Udio (%)
1.	NADZOR I PREGLED CESTA I OBJEKATA	210.878,73 kn	16.733,10 kn	227.611,83 kn	1,76%
2.	ODRŽAVANJE PROMETNIH POVRŠINA	59.387,59 kn	3.966,60 kn	63.354,19 kn	0,49%
3.	ASFALJNI KOLNICI	2.196.679,52 kn	289.558,31 kn	2.486.237,83 kn	19,18%
4.	BANKINE	604.498,19 kn	49.008,18 kn	653.506,37 kn	5,04%
5.	POKOSI	28.107,29 kn	10.296,44 kn	38.403,73 kn	0,30%
6.	ODVODNJA	2.042.567,30 kn	160.132,36 kn	2.202.699,66 kn	17,00%
7.	PROMETNA SIGNALIZACIJA I OPREMA	1.310.371,52 kn	42.445,37 kn	1.352.816,88 kn	10,44%
8.	CESTOVNE NAPRAVE I UREĐAJI	- kn	- kn	0,00 kn	0,00%
9.	VEGETACIJA	1.482.083,87 kn	130.923,15 kn	1.613.007,02 kn	12,45%
10.	OSIGURANJE PREGLEDNOSTI	66.237,60 kn	5.633,88 kn	71.871,48 kn	0,55%
11.	CESTOVNI OBJEKTI	46.779,51 kn	4.099,32 kn	50.878,83 kn	0,39%
12.	INTERVENTNI RADOVI	232.046,80 kn	40.062,77 kn	272.109,57 kn	2,10%
13.	ZIMSKA SLUŽBA	3.189.885,55 kn	738.086,56 kn	3.927.972,11 kn	30,31%
UKUPNO:				12.960.469,50 kn	100%
PDV 25%				3.240.117,38 kn	
SVEUKUPNO:				16.200.586,88 kn	

1.2. **Utrošak natrijevog klorida** za potrebe održavanja županijskih i lokalnih cesta te objekata na području KZŽ za vrijeme zimske službe planiran je u iznosu 1.500.000,00 kn, a utrošeno je u iznosu od 901.744,97 kn odnosno 1.802,01 tona. Natrijev klorid za održavanja cesta i objekata u zimskim uvjetima nabavljaju Hrvatske ceste d.o.o., a prava i obaveze regulirane su temeljem Sporazuma između Hrvatskih cesta d.o.o. i ove Uprave.

Također je uz utrošen natrijev klorid, korišten posipni materijal (kamena sitneža), vrijednosti 389.854,30 kn bez PDV-a obračunate u stavci 13. prije navedene tablice izvedenih radova redovitog održavanja.

Tablica 2. Utrošak natrijevog klorida za potrebe održavanja cesta i objekata za vrijeme zimskih uvjeta

Broj stavke	Naziv i opis stavke	Vrijednost
13.14.3.	Natrijev klorid evidencijski - 1.802,01 t	901.744,97 kn

1.3. Radovi na sanaciji propusta prikazani u tablici 3., obuhvaćaju radove na sanaciji jednog propusta na županijskoj cesti Ž2153 u mjestu Zelenjak ukupne vrijednosti izvedenih radova 410.516,63 kn i radove na sanaciji jednog mosta na lokalnoj cesti L22043 u mjestu Jalšje ukupne vrijednosti izvedenih radova 574.996,88 kn. Predmetni radovi su uspješno realizirani.

Tablica 3 Radovi na sanaciji propusta

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN RADOVA	IZVRŠENJE
1.3.2.	2153	IV	Zelenjak	Radovi na sanaciji propusta	420.000,00 kn	410.516,63 kn
1.3.3.	22043	IV	Jalšje	Radovi na sanaciji mosta	580.000,00 kn	574.996,88 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:					1.000.000,00 kn	985.513,51 kn

1.4. Radovi na sanaciji klizišta na županijskim cestama navedeni u tablici 4., planirani su ukupnom iznosu od 160.000,00 kn, a realizirani u iznosu od 156.986,56 kn. Radovi na sanaciji klizišta Gregurovec na županijskoj cesti Ž2126 su uspješno izvedeni, te su financirani u cijelosti vlastitim sredstvima.

Tablica 4. Radovi na sanaciji klizišta

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN RADOVA 2019	IZVRŠENJE
1.4.1.	2126	IV	Gregurovec	Radovi na sanaciji klizišta	160.000,00 kn	156.982,56 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:					160.000,00 kn	156.982,56 kn

1.4.a Radovi na sanaciji pokosa uz županijske ceste navedeni u tablici 4.a., planirani su ukupnom iznosu od 600.000,00 kn, a realizirani u iznosu od 597.222,13 kn.

Programom sanacije pokosa obuhvaćena je sanacija pokosa izradom AB zida na dvije zasebne lokacije, odnosno na županijskoj cesti Ž2224 u mjestu Jakšinec te uz županijsku cestu Ž2117 u mjestu Stipernica. Radovi su uspješno izvedeni.

Tablica 4 a Radovi na sanaciji pokosa uz županijske ceste

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN RADOVA 2019	IZVRŠENJE
1.4.1.a	2224	III	Jakšinec	Radovi na sanaciji pokosa	300.000,00 kn	298.654,38 kn
1.4.2.a	2117	IV	Stipernica	Radovi na sanaciji pokosa	300.000,00 kn	298.567,75 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:					600.000,00 kn	597.222,13 kn

1.5. Radovi na sanaciji habajućih asfaltnih slojeva na županijskim i lokalnim cestama navedeni u tablici 5., planirani su ukupnom iznosu od 4.600.000,00 kn, a realizirani u iznosu od 4.416.770,92 kn.

Programom sanacije habajućih asfaltnih slojeva na županijskim i lokalnim cestama obuhvaćeno je 14 različitih lokacija na županijskim i lokalnim cestama. Radovima na sanaciji habajućih asfaltnih slojeva ukupno je ugrađeno 40.370,85 m² završnog sloja asfalta na 14 dionica ukupne duljine 7690 m. Dionica lokalne ceste L22053 Lovrečan nije sanirana već će se naknadno rekonstruirati i proširiti nakon izrade projektne dokumentacije, dok je dionica lokalne ceste L22040 Krapinske Toplice izvedena naknadno unutar ugovorenih sredstava.

Tablica 5. Sanacija habajućih asfaltnih slojeva na ŽC i LC

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN RADOVA	IZVRŠENJE
1.5.1.	2093	IV	Trnovec	Sanacija habajućih asfaltnih slojeva	4.600.000,00 kn	4.416.770,92 kn
	2117	IV	Stipernica			
	2151	III	Miljana			
	2169	III	Budinsćina			
	2170	IV	Donja Batina			
	2170	IV	Klimen			
	2215	III	Radakovo			
	22007	IV	Vinagora			
	22052	IV	Donja Batina			
	22040	IV	Krapinske Toplice			
	22053	IV	Lovrečan			
	22038	IV	Mrzlo Polje			
	2168	IV	Mače			
	2186	III	Kraljevec na Sutli			
2198	IV	Donja Stubica				
UKUPNE VRIJEDNOSTI:					4.600.000,00 kn	4.416.770,92 kn

1.6. Radovi na sanaciji opasnih mjesta na županijskim cestama navedeni u tablici 6., planirani su ukupnom iznosu od 495.000,00 kn, a realizirani u iznosu od 493.685,29 kn.

Programom sanacije opasnih mjesta sanirano je pet lokacija na kojima je ugrađen mikroasfalt za povećanje hrapavosti postojećeg asfaltnog zastora. Prvenstveno se radi o sanaciji opasnih zavoja na županijskoj cesti Ž2122 Gornja Šemnica, Ž2160 Štrucijevo, Ž2168 Poznanovec, Ž2195 Zabok i Ž2217 Stubičke Toplice. Radovi su uspješno izvedeni.

Tablica 6. Radovi na sanaciji opasnih mjesta na ŽC

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN RADOVA 2019	IZVRŠENJE
1.6.1.	Više ŽC i LC	III i IV	Područje KZŽ	Sanacija opasnih mjesta na ŽC i LC ugradnjom mikroasfalta	495.000,00 kn	493.685,29 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:					495.000,00 kn	493.685,29 kn

1.7. Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja na županijskim cestama navedeni u tablici 8., planirani su ukupnom iznosu od 25.000,00 kn, a realizirani u iznosu od 26.580,00 kn.

Ova sredstva utrošena su za podmirenje troškova usluga iskolčenja instalacija od strane ovlaštenih javnopravnih tjela na više lokacija za potrebe izvođenja radova održavanja javnih cesta.

Tablica 7. Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN RADOVA 2019	IZVRŠENJE
1.7.1.	Više ŽC i LC	III i IV	Područje KZŽ	Iskolčenja (HT, HEP, Plin i dr.)	25.000,00 kn	26.580,00 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:					25.000,00 kn	26.580,00 kn

1.7.a Radovi na uređenju oborinske odvodnje uz županijske ceste navedeni u tablici 7.a., planirani su ukupnom iznosu od 1.100.000,00 kn, a realizirani u iznosu od 996.503,99 kn.

Programom uređenja oborinske odvodnje uz županijske ceste obuhvaćeno je 6 različitih lokacija na županijskim cestama. Kod realizacije planiranih radova na dionici Ž2122 u mjestu Lopatice nije bilo moguće izvesti planirane radove u cijelosti radi potreba izmještanje podzemne infrastrukture HT-a (optički kabl) i nadzemne NN mreže HEP-a. Realizacija potrebnih radova od strane HT-a izvršiti će se tijekom 2020. godine radi znatnih troškova za distributera koje je bio obavezan osigurati kroz planove radova.

Tablica 7.a Uređenje oborinske odvodnje uz županijske

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN RADOVA 2019	IZVRŠENJE
1.7.1.a	2189	IV	Martinišće	Uređenje oborinske odvodnje	1.100.000,00 kn	996.503,99 kn
1.7.2.a	2171	IV	Hrašćina			
1.7.3.a	2166	IV	Mirkovec			
1.7.4.a	2221	IV	Globočec			
1.7.5.a	2122	III	Lopatice			
1.7.6.a	2192	IV	Veliko Trgovišće			
UKUPNE VRIJEDNOSTI:					1.100.000,00 kn	996.503,99 kn

b) Izvedeni radovi izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta

POZICIJA	RADOVI	PLAN RADOVA	REALIZACIJA
2.	PLANIRANI RADOVI NA KAPITALNIM PROJEKTIMA - REKONSTRUKCIJA CESTA	7.835.000,00 kn	7.539.300,39 kn

Radovi izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2019. godini planirani su u ukupnom iznosu od 7.835.000,00 kn. Vrijednost ukupno izvedenih radova iznosi 7.539.300,39 kn.

2.1. Radovi na kapitalnim projektima - rekonstrukcija cesta navedeni u tablici 8., planirani su radovi u ukupnom iznosu od 4.220.000,00 kn, a realizirani u iznosu od 4.079.346,87 kn.

Radovima na kapitalnim projektima predviđena su tri zahvata, odnosno radovi rekonstrukcije križanja - izgradnja križanja sa kružnim tokom prometa Ž2197 u mjestu Oroslavje, radovi rekonstrukcije lokalne ceste L22040 - Zagrebačka ulica u mjestu Krapinske Toplice, te radovi na rekonstrukciji ŽCP na Ž2198 u Donjoj Stubici- faza 2. Radovi na svim projektima su uspješno izvedeni tijekom 2019. godine.

Tablica 8. Planirani radovi na kapitalnim projektima - rekonstrukcija cesta

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN RADOVA 2019	IZVRŠENJE
2.1.1.	2197	III	Oroslavje	Rekonstrukcija križanja - izgradnja križanja sa kružnim tokom prometa	1.250.000,00 kn	1.242.458,49 kn
2.1.2.	22040	IV	Krapinske Toplice	Rekonstrukcija lokalne ceste L22040 - Zagrebačka ulica	2.800.000,00 kn	2.669.346,98 kn
2.1.3.	2198	IV	Donja Stubica	Radovi na rekonstrukciji željezničkog cestovnog prijelaza - faza 2	170.000,00 kn	167.541,40 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:					4.220.000,00 kn	4.079.346,87 kn

2.2. Usluga stručnog, tehnološkog i geodetskog nadzora navedeni u tablici 9., planirana u ukupnom iznosu od 375.000,00 kn te su realizirani u ukupnom iznosu 371.295,84 kn. Usluge vanjskog stručnog nadzora ugovorene su za praćenje kapitalnih investicija te za praćenje radova sanacije klizišta sufinanciranih od strane Hrvatskih voda.

Tablica 9 Stručni, tehnološki i geodetski nadzor na projektima

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN RADOVA 2019	IZVRŠENJE
2.2.1.	2197	III	Oroslavje	Nadzor nad radovima rekonstrukcije križanja - izgradnja križanja sa kružnim tokom prometa	70.000,00 kn	68.750,00 kn
2.2.2.	22040	IV	Krapinske Toplice	Nadzor nad radovima rekonstrukcije lokalne ceste L22040 - Zagrebačka ulica	97.000,00 kn	96.095,84 kn
2.2.3.	više ŽC i LC	III i IV	Više dionica	Nadzor nad radovima sanacije habajućih asfaltnih slojeva	40.000,00 kn	39.850,00 kn
2.2.5.	22040	IV	Krapinske Toplice	Nadzor nad radovima sanacije klizišta	37.500,00 kn	37.500,00 kn
2.2.6.	22001	IV	Gornji Macelj	Nadzor nad radovima sanacije klizišta	35.500,00 kn	35.500,00 kn
2.2.7.	22010	IV	Donje Jesenje	Nadzor nad radovima sanacije klizišta	45.000,00 kn	44.975,00 kn
2.2.9.	2241	IV	Velinci	Nadzor nad radovima sanacije klizišta	50.000,00 kn	48.625,00 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:					375.000,00 kn	371.295,84 kn

2.3. Radovi na sanaciji klizišta navedeni u tablici 9.a., planirani su ukupnom iznosu od 3.240.000,00 kn, a realizirani u iznosu od 3.088.657,68 kn. Radovi su uspješno realizirani.

Programom sanacije klizišta izvršena je sanacija četiri klizišta na lokalnim i županijskim cestama. Radovi su sufinancirani od strane Hrvatskih Voda temeljem Plana upravljanja vodama za 2019. godinu i Odluke o izvršenju Plana upravljanja vodama za 2019. godinu, a iz Programa sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura. Sufinanciranje je izvršeno u omjeru 55% Hrvatske vode, 45% ŽUC, odnosno iznos sufinanciranja od strane Hrvatskih voda iznosi ukupno 1.544.328,84 kn.

Tablica 9.a Radovi na sanaciji klizišta

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN RADOVA 2019	IZVRŠENJE
2.3.2.	22040	IV	Krapinske Toplice	Radovi na sanaciji klizišta	700.000,00 kn	668.228,71 kn
2.3.3.	22001	IV	Gornji Macelj	Radovi na sanaciji klizišta	570.000,00 kn	562.216,50 kn
2.3.4.	22010	IV	Donje Jesenje	Radovi na sanaciji klizišta	990.000,00 kn	900.058,70 kn
2.3.6.	2241	IV	Velinci	Radovi na sanaciji klizišta	980.000,00 kn	958.153,77 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:					3.240.000,00 kn	3.088.657,68 kn

POZICIJA	RADOVI	PLAN RADOVA	REALIZACIJA
3.	PLANIRANI RADOVI IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	640.000,00 kn	661.825,00 kn

3.1. Izrada projektne dokumentacije za radove izvanrednog održavanja planirana je u vrijednosti od 640.000,00 kn, a realizirana u vrijednosti 661.825,00 kn. Izradom projektne dokumentacije obuhvaćena je potrebna dokumentacija za sanaciju klizišta na županijskim i lokalnim cestama, te dokumentacija za radove na sanaciji pojedinih kritičnih dionica županijskih ili lokalnih cesta, te postupci evidentiranja stvarnog stanja javnih cesta.

Ukupno je izređeno 18 zasebnih projekata, a izrađena projektna dokumentacija navedena je u tablici 10.

Razlika između planiranih sredstava i izvršenja je radi izrade projekta sanacije opasnih mjesta za potrebe natječaja objavljenog od strane MUP-a, Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa, za sufinanciranje sanacije opasnih mjesta u 2020. godini, koji je objavljen u 12. mjesecu 2019. godine. Izradi projekta pristupilo se radi ispunjenja uvjeta natječaja. Budući da je procijenjena vrijednost usluge 19.700,00 kn bez PDV-a ista nije bila navedena u Planu radova. Povećanje vrijednosti izvršene usluge za izradu projekta sanacije klizišta Klenovec Humski na Ž2095 bilo potrebno radi dodatnih geostražnih radova u cilju izrade kvalitetnog projektnog rješenja.

Tablica 10. Izrada projektne dokumentacije za radove izvanrednog održavanja ŽC i LC

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta ugovorenog zahvata	PLAN RADOVA 2019	IZVRŠENJE
3.1.1.	2221	IV	Globočec	Projekt sanacije klizišta	45.000,00 kn	45.000,00 kn
3.1.2.	2095	IV	Klenovec Humski	Projekt sanacije klizišta	45.000,00 kn	57.500,00 kn
3.1.3.	2169	IV	Donja Selnica	Projekt sanacije klizišta	45.000,00 kn	45.000,00 kn
3.1.5.	22001	IV	Gornji Macelj	Novelacija projektne dokumentacije za sanaciju klizišta	20.000,00 kn	20.000,00 kn
3.1.6.	22010	IV	Donje Jesenje	Novelacija projektne dokumentacije za sanaciju klizišta	20.000,00 kn	20.000,00 kn
3.1.7.	2155	III	Tuheljske Toplice	Novelacija projektne dokumentacije za sanaciju klizišta	20.000,00 kn	20.000,00 kn
3.1.8.	22040	IV	Krapinske Toplice	Novelacija projektne dokumentacije za sanaciju klizišta	20.000,00 kn	20.000,00 kn
3.1.9.	2241	IV	Vetinci	Projekt sanacije klizišta	30.000,00 kn	29.375,00 kn
3.1.10.	2224	III	Gornja Stubica	Projekt rekonstrukcije prometnice	40.000,00 kn	39.875,00 kn
3.1.11.	2226	IV	Hum Stubički	Projekt sanacije klizišta	45.000,00 kn	45.000,00 kn
3.1.12.	22096	IV	Štuparje	Projekt sanacije propusta	35.000,00 kn	34.750,00 kn
3.1.13.	22024	IV	Krapinica	Projekt sanacije propusta	35.000,00 kn	34.375,00 kn
3.1.14.	2186 i 2165	III i IV	k.o. Novi Dvori Klanječki	Snimak stvarnog stanja ceste	70.000,00 kn	69.000,00 kn
3.1.16.	2128 i 122042	III i IV	k.o. Vojnovac Loborski i k.o. Klokovec	Snimak stvarnog stanja ceste	35.000,00 kn	23.200,00 kn
3.1.17.	22080	IV	Vilanci	Projekt rekonstrukcije propusta	45.000,00 kn	44.375,00 kn
3.1.18.	2122	III	Biruši	Projekt sanacije klizišta	45.000,00 kn	45.000,00 kn
3.1.19.	2120	III	Stara Ves	Projekt rekonstrukcije propusta	45.000,00 kn	44.750,00 kn
3.1.20.	III i IV	III i IV	III i IV	projekt sanacija opasnih mjesta	0,00 kn	24.625,00 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:					640.000,00 kn	661.825,00 kn

POZICIJA	RADOVI	PLAN RADOVA	REALIZACIJA
4.	GRAD KRAPINA - FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.568.000,00 kn	1.588.338,87 kn

4.1. Županijskoj upravi za ceste KZŽ, temeljem Odluke o razvrstavanju javnih cesta (NN 44/12) i Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (NN 44/12) određena je prekategorizacija ukupno 28,79 km županijskih i lokalnih cesta u nerazvrstane ceste na području grada Krapine. Održavanje tih cesta vrši se sredstvima iz proračuna grada Krapine i sufinancira od strane Županijske uprave za ceste, temeljem članka 108. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19). Tijekom 2019. godine Županijska uprava za ceste je sufinancirala održavanje navedenih cesta u ukupnom iznosu od 1.588.338,87 kn.

POZICIJA	RADOVI	PLAN RADOVA	REALIZACIJA
5.	SUFINANCIRANJE RADOVA REKONSTRUKCIJE I PROŠIRENJA PROMETNICE	1.470.000,00 kn	1.108.623,90 kn

5.1. Sufinanciranje radova rekonstrukcije i proširenja prometnice planirano je u vrijednosti od 1.470.000,00 kn, a realizirano u vrijednosti 1.108.623,90 kn. Tijekom 2019. godine ova Uprava za ceste sufinancirala je četiri zasebna zahvata kojima su nositelji bili jedinice lokalne uprave i samuprave. Grad Klanjec je u cijelosti uspješno realizirao zahvat izrade oborinske odvodnje i proširenja prometnice županijske ceste Ž2186. Radovi od strane grada Zaboka, grada Zlatara i općine Desinić su privremeno prekinuti tijekom 12 mj. 2019. godine te će se u cijelosti realizirati početkom 2020. godine.

Tablica 11. Sufinanciranje radova rekonstrukcije i proširenja prometnice

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	IJS/Naziv dionice	Vrsta planiranog zahvata	PLAN RADOVA 2019	IZVRŠENJE
5.1.	2169	IV	Zlatar/Varaždinska ulica	Rekonstrukcija i proširenje prometnice	800.000,00 kn	487.508,90 kn
5.2.	2186	III	Klanjec/Novi Dvori Klanječki	Oborinska odvodnja i proširenje prometnice	250.000,00 kn	249.987,50 kn
5.3.	2151	III	Desinić/Dubravica	Oborinska odvodnja i proširenje prometnice	220.000,00 kn	171.138,75 kn
5.4.	2195	III	Zabok/Ul. Matije Gupca Đački put	Izvanredno održavanje raskrižja - dopuna semaforizacije	200.000,00 kn	199.988,75 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:					1.470.000,00 kn	1.108.623,90 kn

POZICIJA	RADOVI	PLAN RADOVA	REALIZACIJA
6.	IZVRŠENJE UGOVORA IZ 2018. GODINE	1.423.658,87 kn	1.423.375,89 kn

6.1. Radovi izvanrednog održavanja prema ugovorima iz 2018. godine prikazani su u niže navedenoj tablici 14. Ukupna vrijednost usluga i radova po završetku realizacije iznosi 1.423.375,89 kn. Ovim prikazom obuhvaćene su izvršene usluge izrade tehničke dokumentacije za planirane zahvate izvanrednog održavanja na županijskim cestama te uspješno završeni radovi na sanaciji lokalne cesti L22103 u mjestu Tuheljske Toplice te radovi na županijskoj cesti Ž2198 u mjestu Donja Stubica.

Tablica 14. Neizvršeni radovi i usluge temeljem ugovora iz 2018. godine

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta / naziv	Vrsta usluge	PLAN RADOVA 2019	IZVRŠENJE
14.1.	22103	IV	Tuheljske Toplice	Radovi na sanaciji i proširenju prometnice	461.491,37 kn	461.400,48 kn
14.2.	2198	IV	Donja Stubica	Radovi na rekonstrukciji željezničkog cestovnog prijelaza	842.980,00 kn	842.787,91 kn
14.3.	2198	IV	Donja Stubica	Nadzor nad radovima rekonstrukcije križanja - Radovi na rekonstrukciji željezničkog cestovnog	59.812,50 kn	59.812,50 kn
14.4.	2219	III	Pila	Izvedbeni projekt rekonstrukcije križanja	36.250,00 kn	36.250,00 kn
14.5.	2122	III	Gornja Šemnica	Izvedbeni projekt sanacije propusta	23.125,00 kn	23.125,00 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:					1.423.658,87 kn	1.423.375,89 kn

**REKAPITULACIJA UKUPNO IZVEDENIH RADOVA REDOVITOG I
IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
u razdoblju od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine**

Redni broj	Opis radova	PLAN RADOVA	REALIZACIJA
1.	Planirani radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta	26.719.067,45 kn	24.775.590,26 kn
2.	Planirani radovi na kapitalnim projektima - rekonstrukcija cesta	7.835.000,00 kn	7.539.300,39 kn
3.	Planirani radovi izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta	640.000,00 kn	661.825,00 kn
4.	Grad Krapina-financiranje nerazvrstanih cesta	1.568.000,00 kn	1.588.338,87 kn
5.	Sufinanciranje radova gradovima i općinama	1.470.000,00 kn	1.108.623,90 kn
6.	Neizvršeni radovi i usluge temeljem ugovora iz 2018. godine	1.423.658,87 kn	1.423.375,89 kn
UKUPNO PLANIRANI RADOVI REDOVITOG I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ZA 2019. GODINU:		39.655.726,32 kn	37.097.054,31 kn

Klasa: 023-01/20-01/01
 Urbroj: 2140-12-03/1-20-1
 Pregrada: 12.03.2020.

Ravnatelj:

Stjepan Sirovec, mag.ing.traff.




PRILOG

**PRIKAZ DULJINA KOLNIKA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
RASPODIJELJENIH PO GRADOVIMA I OPĆINAMA**

Grad/Općina	Duljina županijskih cesta	Duljina lokanih cesta	Duljina cesta ukupno
GRAD DONJA STUBICA	12,47	6,39	18,86
GRAD KLANJEC	10,22	9,35	19,57
GRAD OROSLAVJE	12,25	5,77	18,02
GRAD PREGRADA	31,10	6,89	37,99
GRAD ZABOK	23,83	4,99	28,82
GRAD ZLATAR	25,21	18,81	44,02
OPĆINA BEDEKOVČINA	31,66	1,66	33,32
OPĆINA BUDINŠČINA	10,69	7,30	17,99
OPĆINA DESINIĆ	20,46	8,45	28,91
OPĆINA ĐURMANEC	6,16	12,13	18,29
OPĆINA GORNJA STUBICA	21,65	5,68	27,33
OPĆINA HRAŠČINA	9,37	11,33	20,70
OPĆINA HUM NA SUTLI	8,60	8,32	16,92
OPĆINA JESENJE	0,00	5,82	5,82
OPĆINA KONJIŠČINA	8,28	20,40	28,68
OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI	14,94	7,13	22,07
OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE	14,69	19,45	34,14
OPĆINA KUMROVEC	6,61	5,66	12,27
OPĆINA LOBOR	9,83	6,36	16,19
OPĆINA MAČE	8,28	2,21	10,49
OPĆINA MARIJA BISTRICA	19,10	8,06	27,16
OPĆINA MIHOVLJAN	11,77	1,52	13,29
OPĆINA NOVI GOLUBOVEC	4,64	2,42	7,06
OPĆINA PETROVSKO	6,83	1,66	8,49
OPĆINA RADOBOJ	14,55	9,43	23,98
OPĆINA STUBIČKE TOPLICE	17,59	0,00	17,59
OPĆINA SV. KRIŽ ZAČRETJE	24,56	2,26	26,82
OPĆINA TUHELJ	10,36	7,01	17,37
OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE	16,27	24,90	41,17
OPĆINA ZAGORSKA SELA	2,47	6,20	8,66
OPĆINA ZLATAR BISTRICA	0,00	9,82	9,82
Ukupno km	414,43	247,36	661,79

Duljina kolnika županijskih i lokanih cesta po gradovima i općinama

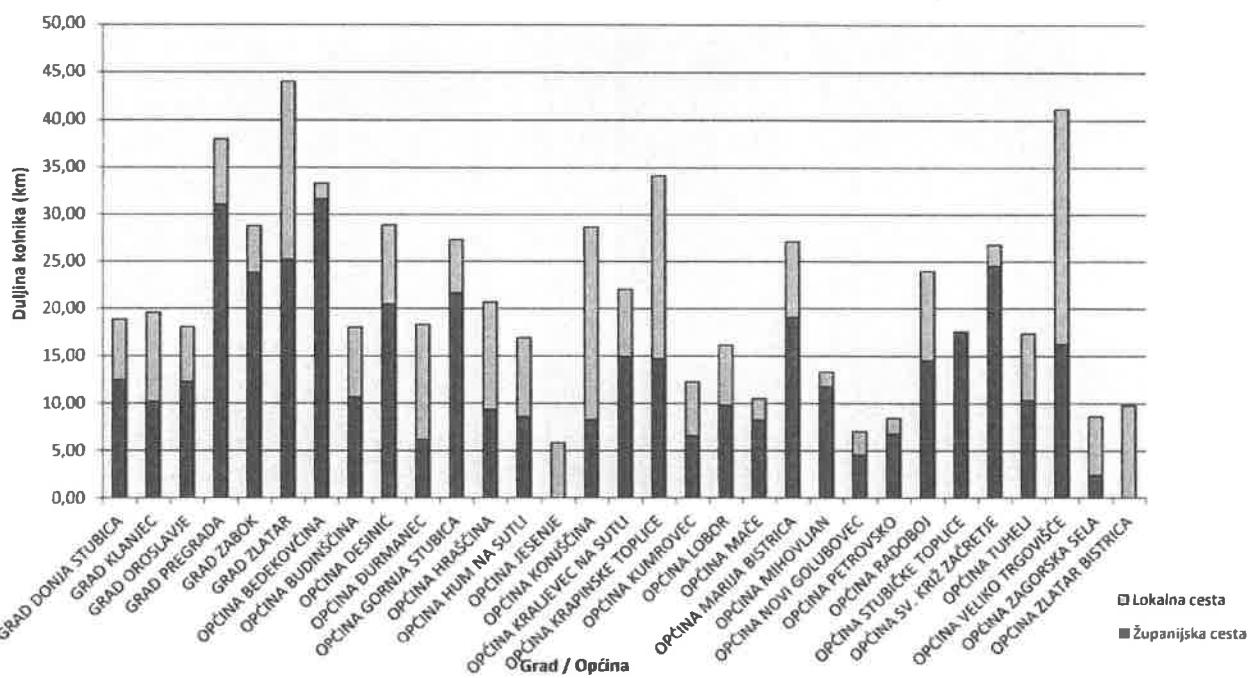



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

KLASA: 340-01/20-01/09

URBROJ: 2140/01-01-20-4

Krapina, _____ 2020.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst i 13/18), **Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije** na 20. sjednici održanoj dana _____ 2020. godine donijela je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu za 2019. godinu
Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije

- I. Prihvaća se Izvješće o radu za 2019. godinu Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.
- II. Izvješće iz toč. I. ovog Zaključka nalazi se u pravitku i čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Vlasta Hubicki, dr. vet. med.

DOSTAVITI:

1. Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije,
n/p ravnatelja, Pregrada, J. Leskovara 40/1,
2. «Službeni glasnik KZZ», za objavu,
3. za prilog zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.
