




Izvješće o radu 2014. godine




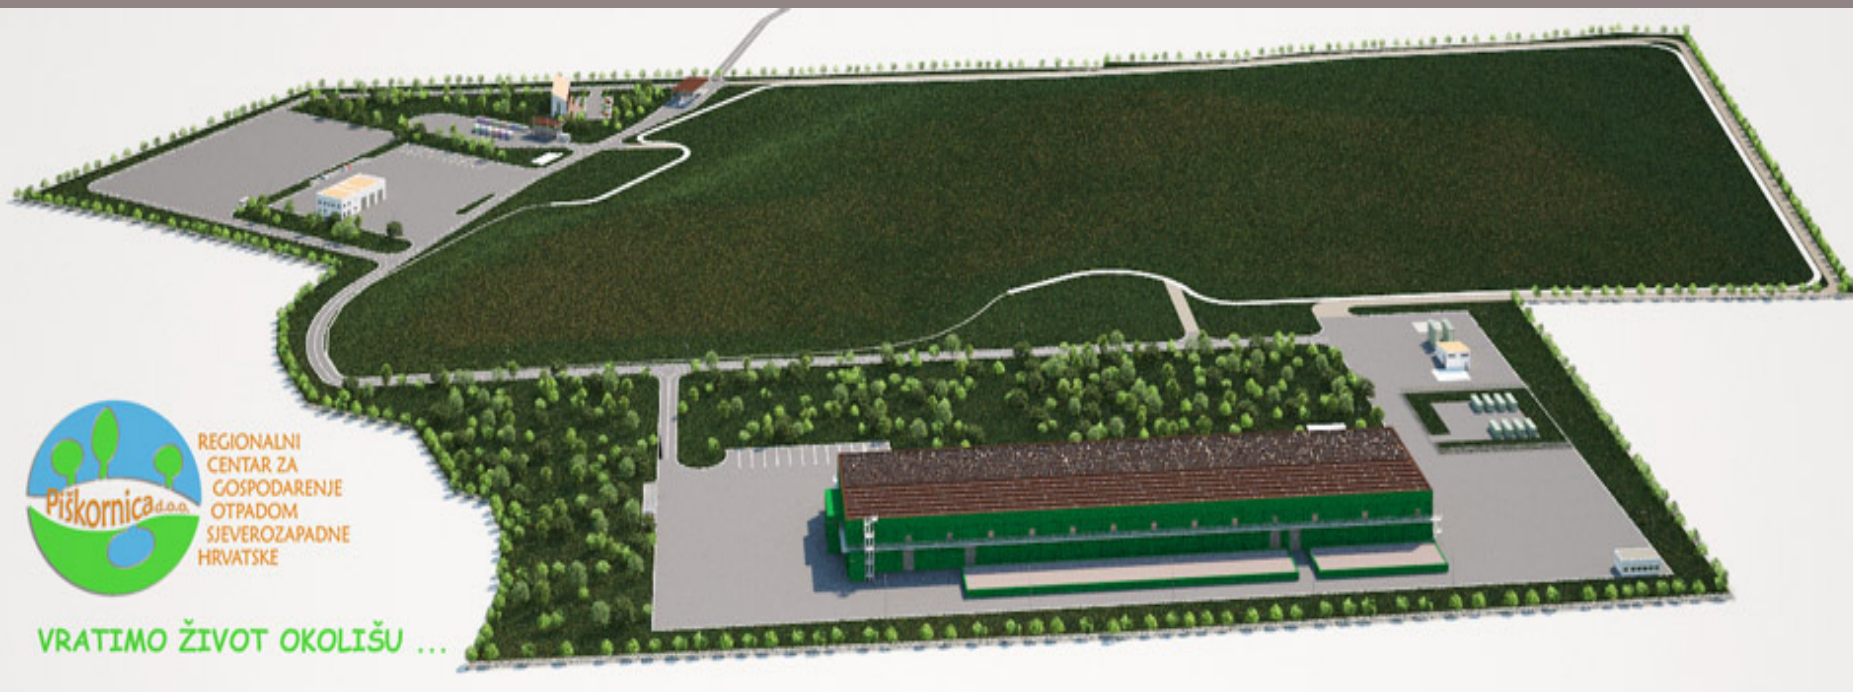


Matije Gupca 12 • HR-48314 Koprivnički Ivanec • Ured: Ul. ure Estera 11 • HR-48000 Koprivnica
tel. +385 048/220 242 /247 /248 • fax +385 048/220 248




Regionalni Centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske “Piškornica”



**Koprivničko-
križevačka
županija**




**Krapinsko-zagorska
županija**



**Međimurska
županija**



**Varaždinska
županija**



**Općina Koprivnički
Ivanec**



Matije Gupca 12 • HR-48314 Koprivnički Ivanec • Ured: Ul. ure Estera 11 • HR-48000 Koprivnica
tel.+385 048/220 242 /247 /248 • fax +385 048/220 248

Osnivači društva Piškornica

Tvrtka „Piškornica“ d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske (skraćeno „Piškornica“ d.o.o.) osnovana je 12. ožujka 2009. godine potpisivanjem Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva.

- Koprivničko-križevačka županija 22,5%,
Krapinsko-zagorska županija 22,5%,
Međimurska županija 22,5%,
Varaždinska županija 22,5%,
Općina Koprivnički Ivanec 10%



Matije Gupca 12 • HR-48314 Koprivnički Ivanec • Ured: Ul. ure Estera 11 • HR-48000 Koprivnica
tel.+385 048/220 242 /247 /248 • fax +385 048/220 248

- 20. veljače 2014. godine izvršen je upis poslovne jedinice Zagreb na adresi Ilica 1/a, 10000 Zagreb
- „Piškornica“ d.o.o. je do 23. rujna 2014. godine poslovala na adresi poslovne jedinice u Koprivnici, Đure Estera 11, 48000 Koprivnica
- Od dana 24. rujna 2014. godine posluje na adresi sjedišta u Koprivničkom Ivancu, Matije Gupca 12, 48314 Koprivnički Ivanec (zgrada Općine Koprivnički Ivanec, I. kat).



Matije Gupca 12 • HR-48314 Koprivnički Ivanec • Ured: Ul. ure Estera 11 • HR-48000 Koprivnica
tel.+385 048/220 242 /247 /248 • fax +385 048/220 248

Izvori sredstava

- Prvotna planirana sredstva osnivača za sufinanciranje troškova poslovanja društva Piškornica - 1.333.333,34 kn (300.000,00 kn Županije i 133.333,34 kn Općina)
- Zbog povećanja neplaniranih troškova koji su nastali tijekom 2014. godine u postupku razvoja i realizacije projekta RCGO Piškornica → Skupština društva Piškornica na 19. sjednici 27. svibnja 2014. godine donosi Odluku o prihvaćanju prijedloga Rebalansa financijskog plana društva „Piškornica“ d.o.o. za 2014. godinu
- Sukladno navedenoj Odluci osnivači su za 2014. godinu planirali sredstva od **ukupno 2.050.555,55 kuna** (461.375,00 kn Županije i 205.055,55 kn Općina)

Izvori sredstava

| Osnivači | Planirani iznos (kn) | Realizirani trošak (kn) | Traženi iznos (kn) | Uplaćeni iznos (kn) | Razlika (D -E) +/- (kn) |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| A | B | C | D | E | F |
| Koprivničko-križevačka županija | 461.375,00 | 463.241,67 | 461.375,00 | 443.100,91 | -18.274,09 |
| Krapinsko-zagorska županija | 461.375,00 | 463.241,67 | 457.389,94 | 457.389,94 | 0,00 |
| Međimurska županija | 461.375,00 | 463.241,67 | 461.375,00 | 190.220,65 | -271.154,35 |
| Varaždinska županija | 461.375,00 | 463.241,67 | 457.389,94 | 367.239,01 | -90.150,93 |
| Općina Koprivnički Ivanec | 205.055,55 | 205.885,07 | 203.051,09 | 180.450,47 | -22.600,62 |
| UKUPNO | 2.050.555,55 | 2.058.851,75 | 2.040.580,97 | 1.638.400,98 | -402.179,99 |



Matije Gupca 12 • HR-48314 Koprivnički Ivanec • Ured: Ul. ure Estera 11 • HR-48000 Koprivnica
tel. +385 048/220 242 /247 /248 • fax +385 048/220 248

Izvršenje rada programa: projektno – tehnička dokumentacija

- Provedeni su postupci javne nabave za uslugu izrade projektno – tehničke dokumentacije za potrebe PS Zabok i Varaždin → potpisan ugovor s odabranim pouditeljim IPZ Uniprojekt TERRA (izrada navedene dokumentacije u tijeku)
- Naručena je izrada geodetskih projekata za PS Zabok i PS Varaždin → započeta prva faza (izrada geodetskog situacijskog nacrtu stvarnog stanja u položajnom i visinskom smislu)
- MZOIP je predan Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš Pretovarne stanice Zabok → 08.01.2015. g. MZOIP izdalo Rješenje prema kojem za navedeni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, kao ni glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu



Matije Gupca 12 • HR-48314 Koprivnički Ivanec • Ured: Ul. ure Estera 11 • HR-48000 Koprivnica
tel. +385 048/220 242 /247 /248 • fax +385 048/220 248

Izvršenje rada programa: projektno – tehnička dokumentacija

- Nakon provedenog postupka javne nabave 05.06.2014. g. sklopljen je ugovor (2.445.000,00 kn) o pružanju odvjetničkih usluga sa zajednicom ponuditelja Odvjetničko društvo Hačić, Kallay & partneri d.o.o. i Odvjetničko društvo Hanžeković & partneri d.o.o., a vezano za izradu natječajne i ugovorne dokumentacije za:
 - izvođenje usluga i radova za izgradnju RCGO Piškornica
 - izvođenje radova za izgradnju pretovarnih stanica
 - usluge FIDIC inženjera
 - usluge tehničke pomoći PR-a
- 30.12.2014 pokrenut je otvoreni postupak javne nabave (temeljem dokumentacije odobrene od FZOEU i MZOIP) za usluge izrade studije izvedivosti i projektne aplikacije za sufinansiranje projekta RCGO „Piškornica“ iz EU fondova



Matije Gupca 12 • HR-48314 Koprivnički Ivanec • Ured: Ul. ure Estera 11 • HR-48000 Koprivnica
tel. +385 048/220 242 /247 /248 • fax +385 048/220 248

Izvršenje rada programa: projektno – tehnička dokumentacija

- 29.12.2014. g. raspisan je ograničeni postupak javne nabave **projektiranja i izvođenja svih radova potrebnih za izgradnju RCGO „Piškornica“** – procijenjene vrijednosti **527.000.000,00 kuna**
 - Postupku raspisivanja ovog natječaja prethodilo je davanje suglasnosti na natječajnu dokumentaciju MZOIP i FZOEU – izdana Piškornici d.o.o. 19.12. 2014. g.

Izvršenje programa rada: osiguranje financija

- Temeljem Odluke Fonda od 13.1.2014. s Fondom je sklopljen 14.1.2014. Ugovor o neposrednom financiranju usluga izrade projektne i studijske dokumentacije potrebne za prijavu projekta RCGO „Piškornica“ na sufinanciranje iz EU fondova, davanjem kapitalne pomoći → financiranje već ugovorene i izrađene projektne dokumentacije u iznosu od 279.700,00 kuna
- Ishodovane su potrebne suglasnosti osnivača za podizanje beskamatnog zajma od FZOEU u iznosu od 3.029.595,10 kn → potrebno za otkup preostalog zemljišta u svrhu rješavanja imovinsko – pravnih odnosa
- Ugovor s Fondom do dana sastavljanja ovog izvještaja realiziran je u iznosu od 1.626.930,00 kuna za otkup zemljišta za potrebe pretovarne stanice u Zaboku te za dio zemljišta u obuhvatu zahvata RCGO Piškornica

Izvršenje programa rada: Sporazum o preuzimanju otpada

- Sporazum o preuzimanju otpada ostao je na broju 108 od ukupnih 110 → nisu potpisale Općina Sokolovac i Grad Koprivnica u Koprivničko – križevačkoj županiji

| ŽUPANIJA | SPORAZUM | |
|------------------------|------------|------------|
| | Potpisan | Nepotpisan |
| Koprivničko-križevačka | 23 | 2 |
| Krapinsko-zagorska | 32 | 0 |
| Međimurska | 25 | 0 |
| Varaždinska | 28 | 0 |
| UKUPNO | 108 | 2 |

Izvršenje programa rada: Otkup zemljišta

- Sklopljen je i u zemljišnim knjigama proveden Ugovor o osnivanju prava građenja na nekretninama u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije (7,4 ha)
- Otkupljeno je 0,66 ha zemljišta za potrebe PS Zabok u vrijednosti 856.050,00 kn
- 10. 9.2014. otkupljena je nekretnina (6,3 ha) u vlasništvu Općine Koprivnički Ivanec
- Piškornica d.o.o. je osnovala društvo Piškornica – sanacijsko odlagalište j.d.o.o. (s odvojenim financijskim poslovanjem – pravila EU), a koje bi preuzelo upravljanje odlagalištem otpada „Piškornica“ kojim je do sada upravljao GKP Komunalac Koprivnica, a sve do početka rada RCGO „Piškornica“

Izvršenje programa rada: Otkup zemljišta

- Provedeni su uspješni pregovori u rješavanju imovinsko – pravnih odnosa s Gradom Koprivnica i GKP Komunalac Koprivnica → 19.12.2014. sklopljen ugovor sa tvrtkom Ernst & Young savjetovanje d.o.o. radi izrade procjene vrijednosti imovine ili obveza vezano za odlagalište otpada „Piškornica“ s ciljem definiranja cijene i uvjeta preuzimanja preostalog dijela zemljišta u vlasništvu GKP Komunalac
- U listopadu 2011. godine u DUUDI predan Zahtjev za darovanje nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske društvu Piškornica d.o.o. → realizacija istog još uvijek je u tijeku (od ukupno 13,6 ha tog zemljišta Piškornica d.o.o. ima pravo građenja na 5,6 ha)

Izvršenje programa rada: Otkup zemljišta

| Red. br. | Vlasništvo | Površina (ha) | % |
|----------|--|---------------|------|
| 1. | "Piškornica" d.o.o. | 14,3 | 31,8 |
| 2. | Koprivničko-križevačka županija (PRAVO GRAĐENJA) | 7,4 | 16,4 |
| 3. | Fizičke osobe | 4,8 | 10,7 |
| 4. | GKP Komunalac Koprivnica | 4,9 | 10,9 |
| 5. | Republika Hrvatska (PRAVO GRAĐENJA) | 5,6 | 12,5 |
| 6. | Republika Hrvatska (zahtjev u DUUDI - u realizaciji) | 8 | 17,7 |

Realizirane aktivnosti izvan programa rada

- U siječnju 2014. g. predan je zahtjev za kupoprodaju, ili pravo građenja na nekretnini u vlasništvu Hrvatskih šuma u svrhu izgradnje PS Varaždin → dobiven je pozitivan odgovor od strane Hrvatskih šuma za prodaju iste nekretnine
- Povjerenstvo za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata donijelo je na svojoj sjednici održanoj 3. travnja 2014. godine, Odluku o uvrštenju na Listu strateških projekata, projekt pod nazivom Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica – RCGO Piškornica → Odluka o osnivanju Operativne skupine za pripremu i provedbu prijedloga strateškog projekta Piškornica; Odluka o imenovanju voditelja Operativne skupine

Realizirane aktivnosti izvan programa rada

- Na 154. sjednici Vlade Republike Hrvatske donesen zaključak kako se zadužuje resorni potpredsjednik Vlade zadužen za konzumiranje sredstava europskih fondova da redovito izvještava Vladu te je dan nalog ministarstvima pravosuđa, gospodarstva, zaštite okoliša i prirode, kao i nadležnom Uredu državne uprave u Koprivničko – križevačkoj županiji, da predmete u kojima je podnositelj Piškornica d.o.o. rješava u roku od 8 dana.
- Potpisan je ugovor s tvrtkom Nabava d.o.o. → **provođenje** postupaka javne nabave
- Ugovorena je izrada parcelacijskog elaborata za pristupnu cestu do RCGO Piškornica (izrada u tijeku)
- Izrađene su nove procjene vrijednosti zemljišta preostalog za otkup u obuhvatu zahvata RCGO Piškornica

Realizirane aktivnosti izvan programa rada

- Na prijedlog Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata, a na temelju Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 133/2013) i članka 11. stavka 1. Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 133/2013), **Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o proglašenju projekta pod nazivom Regionalni centar za gospodarenje otpadom (RCGO) sjeverozapadne Hrvatske Piškornica strateškim projektom Republike Hrvatske (NN 72/14)**

Realizirane aktivnosti izvan programa rada

- Održani su sastanci s jedinicama lokalne samouprave (Grad Ludbreg, Općina Gola, Grad Novi Marof, Grad Križevci, Općina Sveti Ivan Žabno i Grad Mursko Središće) → sanacije prepuštaju društvu Piškornica → osnovano društvo Piškornica sanacije j.d.o.o. (s odvojenim financijskim poslovanjem)
- Na novokupljenoj nekretnini k.č.br. 3082/60 u k.o. Koprivnički Ivanec, na lokaciji odlagališta Piškornica ugovorena je zaštitarska usluga za kontrolu prava prolaza za vozila u vlasništvu GKP Komunalac Koprivnica → nabavljen uredski kontejner sa sanitarnim čvorom, izvršen prijenos priključka za vodu te uz suglasnost GKP Komunalac Koprivnica osiguran dovod električne energije

Učinci realiziranih projekata/aktivnosti

- Slijedom svih provedenih aktivnosti u 2014. godini došlo je do visoke faze razvoja i realizacije projekta RCGO „Piškornica“ pa je raspisivanje ograničenog postupka javne nabave za izvođenje radova u prosincu protekle godine od velike važnosti za realizaciju izgradnje RCGO sjeverozapadne Hrvatske
- S obzirom na to da je važnost projekta RCGO „Piškornica“ kao strateškog projekta od interesa za Republiku Hrvatsku, Vlada RH osigurala je bespovratna sredstva za projekte koji se pripremaju za sufinanciranje iz sredstava fondova EU dostupnih za financijsko razdoblje 2014. – 2020. godine te je vrijednost ukupnih troškova projekta procijenjena je na **760.000.000,00 kuna**



Matije Gupca 12 • HR-48314 Koprivnički Ivanec • Ured: Ul. ure Estera 11 • HR-48000 Koprivnica
tel.+385 048/220 242 /247 /248 • fax +385 048/220 248

Hvala na pažnji!

Mladen Jozinović DIPL. ING.
www.rcgo-piskornica.hr

MB: 2502283 • Žiro račun: 2360000-1102078148 Zagrebačka banka
piskornica@kc.t-com.hr
www.rcgo-piskornica.hr
