



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 340-01/24-01/04
URBROJ: 2140-02-24-04
Krapina, 22. svibnja 2024.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije** na 17. sjednici održanoj dana 22. svibnja 2024. godine donijela je

ZAKLJUČAK
o prihvatanju Izvješća o radu za 2023. godinu
Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije

- I. Prihvaća se Izvješće o radu za 2023. godinu Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.

- II. Izvješće iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u prilogu i čini njegov sastavni dio.



DOSTAVITI:

1. Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnatelja, Pregrada, J. Leskovara 40/1,
2. «Službeni glasnik KZZ», za objavu,
3. za prilog zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49218 Pregrada, Janka Leskovara 40/1

Izvješće o radu za 2023. godinu



U Pregradi, ožujak 2024. godine

1. Opći dio

Temeljem Zakona o javnim cestama (NN 100/96) i Odluke Skupštine Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 1/97) Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu Županijska uprava za ceste) započela je s radom 01.01.1998. godine.

Županijska uprava za ceste je sukladno članku 2. Pravilnika o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne(regionalne) samouprave te o načinu vođenja registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Narodne Novine broj: 128/09, 142/14, 23/19, 83/21) izvanproračunski korisnik Krapinsko-zagorske županije.

Županijska uprava za ceste je pravna osoba upisana u registar ustanova pri Trgovačkom sudu u Zagrebu. Županijsku upravu za ceste zastupa i predstavlja Ravnatelj Stjepan Sirovec, mag.ing.traff. te njome rukovodi.

Unutarnjim ustrojem u Županijskoj upravi za ceste ustrojeni su:

- Ured ravnatelja i
- Organizacijske jedinice:
 1. Odjel za obavljanje poslova održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta,
 2. Odjel za obavljanje poslova građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta,
 3. Odjel za financijske, pravne i opće poslove.

U Županijskoj upravi za ceste zaposleno je 9 djelatnika na neodređeno vrijeme i to 5 djelatnika sa VSS, 3 djelatnika sa VSS, 1 djelatnik sa SSS.

Županijskom upravom za ceste upravlja Upravno vijeće koje broji 5 članova.

U Upravno vijeće imenuju se predstavnici:

- Krapinsko-zagorske županije (četiri člana),
- radnika Županijske uprave za ceste (jedan član).

Četiri člana Upravnog vijeća – predstavnika Krapinsko-zagorske županije imenuje Županijska skupština, a jednog člana Upravnog vijeća – predstavnika radnika izabiru radnici u skladu sa Zakonom.

Predsjednika Upravnog vijeća biraju članovi Upravnog vijeća. Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

Rješenjem o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije, izdanim od Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije 07. listopada 2021. godine, članovi Upravnog vijeća imenovani su kako slijedi: Nikola Boromisa, Žarko Miholić, Josip Kovačić, Davor Kljak. Po provedenim izborima između radnika, za predstavnika radnika izabrana je Ivana Palčec. Za predsjednika Upravnog vijeća, članovi su izabrali Nikolu Boromisa.

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste obavlja slijedeće poslove: donosi Statut i druge opće akte; provodi natječajni postupak i predlaže Županijskoj skupštini kandidata za imenovanje ravnatelja; sklapa ugovor o radu s ravnateljem; donosi programe rada i razvoja; nadzire izvršavanje usvojenih programa i planova; donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana uz suglasnost Županijske skupštine; predlaže osnivaču promjenu djelatnosti; daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima iz djelatnosti Uprave za ceste; donosi odluke u drugom stupnju, u vezi predmeta kojima se odlučuje o pravima radnika; odlučuje o nabavi osnovnih sredstava čija pojedinačna vrijednost prelazi 9.290,60 EUR, bez PDV; donosi i druge odluke, te obavlja i druge poslove sukladno Zakonu, Odluci o osnivanju, Statutu ili drugim aktima.

Temeljem članka 83. Zakona o cestama (Narodne Novine broj: 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23 i 133/23) Županijska uprava za ceste u okviru svoje djelatnosti organizira, odnosno obavlja poslove:

1. Pripreme izrade stručnih podloga za četverogodišnje programe građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta.

2. Građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta:

- pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija te njihovu stručnu ocjenu,
- pokretanje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, odnosno pokretanja postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš,
- pokretanje postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu,
- ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima,
- ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih objekata i prometne signalizacije,
- ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je dopušteno građenje i uporaba građevine po posebnom propisu,
- ustupanje radova izmještanja komunalne i druge infrastrukture,
- ustupanje geodetskih radova,

- ustupanje radova građenja i rekonstrukcije,
- ustupanje usluga stručnog nadzora građenja
- organizaciju tehničkog pregleda i primopredaju županijskih i lokalnih cesta te dijelova županijskih i lokalnih cesta i objekata na korištenje i održavanje,
- investitorski nadzor nad provođenjem projekata,
- ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima županijska i lokalna cesta mora udovoljiti u pogledu sigurnosti prometa.

3. Održavanja županijskih i lokalnih cesta:

- planiranje održavanja i mjera zaštite županijskih i lokalnih cesta i prometa na njima,
- redovito i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta,
- ustupanje radova redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- ustupanje usluga stručnog nadzora i kontrole kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s županijskih i lokalnih cesta,
- ophodnja.

4. Ostali poslovi upravljanja županijskim i lokalnim cestama:

- osiguranje obavješćivanja javnosti o stanju i prohodnosti županijskih i lokalnih cesta, izvanrednim događajima na njima i o meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa,
- vođenje podataka o županijskim i lokalnim cestama,
- odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na županijskim i lokalnim cestama,
- praćenje i analiza stanja sigurnosti prometa na županijskim i lokalnim cestama,
- izrada izvješća, elaborata, ekspertiza i sličnih materijala za potrebe Županijske skupštine i Župana.

5. Ostali poslovi utvrđeni Zakonom:

- rješavanje imovinskopravnih odnosa potrebnih za građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta,
- financiranje građenja, rekonstrukcije i održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- praćenje prometnog opterećenja i prometnih tokova na županijskim i lokalnim cestama.

U okviru javnih ovlaštenja Županijska uprava za ceste obavlja javnu ovlast kada izdaje akte iz članka 46. stavka 4., članka 49. stavka 4., članka 51. stavka 3. i članka 52. stavka 1. Zakona.

Djelatnost iz st. 1. ovog članka ne obavlja se radi stjecanja dobiti, a možebitnu dobit Županijska uprava za ceste dužna je koristiti za građenje i održavanje županijskih i lokalnih cesta.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o cestama i Uredbe o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (NN 34/12), Ministar mora, prometa i infrastrukture donio je Odluku o razvrstavanju javnih cesta (NN 59/23) kojom se javne ceste razvrstavaju u četiri skupine i to: autoceste, državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste.

Slijedom ranije navedene Odluke na području Krapinsko-zagorske županije ova Uprava upravlja sa:

424,006 km županijskih cesta

247,322 km lokalnih cesta

671,328 km UKUPNO

Temeljem Zakona o cestama, Zakona o proračunu, Zakona o javnoj nabavi te ostalih zakonskih propisa koje je u okviru svog poslovanja obavezna primjenjivati Županijska uprava za ceste, u 2023. godini postupano je po 1476 neupravnih predmeta te 174 upravnih predmeta.

Županijska uprava za ceste kao izvanproračunski korisnik jedinice područne (regionalne) samouprave, između ostalih zakonskih propisa, obvezna je provoditi odredbe Zakona o javnoj nabavi, vezano na odredbu članka 33. Zakona o cestama, kojim je izvođenje radova građenja i rekonstrukcije, te radova održavanja javnih cesta, obvezna ustupiti pravnoj i fizičkoj osobi koja je za te radove registrirana, specijalizirana i opremljena, te koja raspolaže osposobljenim kadrovima za izvođenje radova i pod prometom, pa je slijedom istog u tijeku 2023. godine provela:

- 19 postupaka nabave roba, radova i usluga male vrijednosti
- 58 postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga

Sukladno Zakonskim propisima te Statutu ŽUC-a doneseni su svi potrebni akti i programi rada za normalno funkcioniranje uprave.

2. PRIHODI I PRIMICI I RASHODI I IZDACI OSTVARENI U 2023. GODINI

Ukupno ostvareni prihodi i primici u 2023. godini uvećani za preneseni višak prihoda iz 2022. godine iznose 17.079.482,37 EUR što je 2,23% više od planiranog za 2023. godinu. Ukupno izvršeni rashodi i izdaci u 2023. godini iznose 15.779.971,99 EUR što je 94,45% planiranog za 2023. godinu. Ostvaren višak prihoda u 2023. godini iznosi 1.299.510,38 EUR te će navedeni iznos biti raspoređen I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu na radove redovitog i izvanrednog održavanja te za dodatna ulaganja na županijskim i lokalnim cestama.

Tablica 1. Prihodi i primici ostvareni u 2023. godini

| KONTO VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | PLANIRANO | REALIZIRANO | INDEKS |
|---|----------------------|----------------------|----------------|
| SVEUKUPNO PRIHODI | 16.707.297,55 | 17.079.482,37 | 102,23% |
| 6 Prihodi poslovanja | 14.888.757,40 | 15.514.753,08 | 104,20 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 9.501.468,58 | 9.834.933,33 | 103,51 |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | | 497.667,70 | 0,00 |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | 9.337.265,63 | 0,00 |
| 64 Prihodi od imovine | 5.371.816,26 | 5.629.651,76 | 104,80 |
| 641 Prihodi od financijske imovine | | 1.435,33 | 0,00 |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | | 5.628.216,43 | 0,00 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 3.981,68 | 35.309,48 | 886,80 |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | | 35.309,48 | 0,00 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 663,61 | 740,21 | 111,54 |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | | 740,21 | 0,00 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 10.827,27 | 14.118,30 | 130,40 |
| 681 Kazne i upravne mjere | | 9.694,70 | 0,00 |
| 683 Ostali prihodi | | 4.423,60 | 0,00 |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 1.700.000,00 | 1.446.189,14 | 85,07 |
| 84 Primici od zaduživanja | 1.700.000,00 | 1.446.189,14 | 85,07 |
| 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | 1.446.189,14 | 0,00 |
| 9 Vlastiti izvori | 118.540,15 | 118.540,15 | 100% |
| 92 Rezultat poslovanja | 118.540,15 | 118.540,15 | 100% |
| 922 Višak/manjak prihoda | | 118.540,15 | 0,00% |

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna za 2023. godinu planirane su u iznosu od 9.501.468,58 EUR, a ostvarene su u iznosu od 9.834.933,33 EUR, odnosno 333.464,75 EUR više od planiranog za 2023. godinu.

Pomoći su ostvarene po skupinama kako slijedi :

- **Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima** u iznosu od 450.512,40 EUR ostvarene su od: Ministarstva mora, prometa i infrastrukture temeljem Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2023. godini u iznosu od 384.151,00 EUR i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture temeljem Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu građenja biciklističke infrastrukture na županijskim i lokalnim cestama u 2023. godini u iznosu od 66.361,40 EUR. Navedene pomoći nisu bile planirane Financijskim planom za 2023. godinu, obzirom da su Odluke o dodjeli sredstava donijete tek krajem 2023. godine te će se ostvarena sredstva koristiti u 2024. godini.
- **Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima** u iznosu od 47.155,30 EUR ostvarene su od Krapinsko-zagorske županije temeljem Ugovora o sufinanciranju građenja sustavnih građevina za sanaciju klizišta na području Krapinsko-zagorske županije sklopljenog između Krapinsko-zagorske županije i Hrvatskih voda. Sukladno Ugovoru, doznačena su sredstva u vrijednosti od 55% ukupno izvedenih radova za sanaciju klizišta Hršak Breg na ŽC2155.
- **Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** koje su ostvarene u iznosu od 7.220.625,31 EUR ostvarene su temeljem sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. Izvedeni su radovi na sanaciji javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora.
- **Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** u iznosu od 2.116.640,32 EUR ostvarene su temeljem sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. Sredstva su ostvarena temeljem sklopljenih 14 Ugovora sa Krapinsko-

zagorskom županijom koja je bila tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa za radove na sanaciji klizišta te propusta oštećenih u potresu.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine za 2023. godinu planirani su u iznosu od 5.371.816,26 EUR, a ostvareni su u iznosu od 5.629.651,76 EUR odnosno 257.835,50 EUR više od planiranog za 2023. godinu.

Prihodi su ostvareni od:

- **Prihoda od financijske imovine** u iznosu od 1.435,33 EUR, a čine ih kamate na depozite po viđenju po poslovnom računu i

- **Prihoda od nefinancijske imovine** u iznosu od 5.628.216,43 EUR, a čine ih naknade za ceste.

Naknade za ceste ostvaruju se od:

- *godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priklučnih vozila* (u daljnjem tekstu godišnja naknada za ceste) putem uplata stanica za tehnički pregled vozila i izravnim uplatama na izdvojeni račun Županijske uprave za ceste te od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za nadoknadu iznosa godišnje naknade za ceste koja nije ostvarena zbog ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja godišnje naknade za ceste osoba s invaliditetom propisanih člankom 88. stavcima 1. i 2. Zakona o cestama. Prihod od godišnje naknade za ceste ovisi o broju registriranih vozila tijekom godine. U odnosu na 2022. godinu broj registriranih vozila je u blagom porastu, ukupno je tijekom 2023. godine registrirano 74 282 vozila, odnosno 3 660 vozila više te je samim time i ostvarenje prihoda veće u odnosu na isto razdoblje prethodne godine;

- *naknade za korištenje cestovnog zemljišta* temeljem sklopljenih Ugovora o osnivanju prava služnosti sa investitorima vodnih građevina, energetskih građevina te građevina elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme na javnoj cesti, odnosno osobama koje su na temelju posebnog zakona ovlaštene upravljati tim građevinama i infrastrukturom te temeljem Ugovora o korištenju cestovnog zemljišta za postavljanje reklamnih putokaza uz županijske i lokalne ceste.

- *naknade za izvanredni prijevoz* od Hrvatskih cesta d.o.o. temeljem izdanih dozvola za izvanredni prijevoz prema kilometraži prometovanja po županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županije

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada za 2023. godinu planirani su u iznosu od 3.981,68 EUR, a ostvareni su u iznosu od 35.309,48 EUR. Prihodi su ostvareni od Općine Zagorka Sela i Općine Kumrovec kao naknada za sanaciju šteta od prirodnih nepogoda temeljem Odluke o proglašenju elementarne nepogode za područje općine Zagorska Sela i općine Kumrovec koje je donio župan Krapinsko-zagorske županije zbog velike materijalne štete koja je između ostalog nastala i na komunalnoj infrastrukturi.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija za 2023. godinu planirani su u iznosu od 663,61 EUR, a ostvareni su u iznosu od 740,21 EUR. Prihodi su ostvareni od radnika za refundacije troškova korištenja mobilnih telefona u službene svrhe koje ne pokriva Županijska uprava za ceste, a sve sukladno Pravilniku o korištenju mobilnih telefona u službene svrhe.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi za 2023. godinu planirani su u iznosu od 10.827,27 EUR, a ostvareni su u iznosu od 14.118,30 EUR i to od naplaćenih ugovornih kazni temeljem sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi za izvođenje radova, naplate ugovornog jamstva za ozbiljnost ponude ponuditelja koji je nakon provedenog postupka javne nabave odustao od svoje ponude u roku valjanosti ponude te od naplate troškova postupka temeljem pravomoćne sudske presude u korist Županijske uprave za ceste.

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja Financijskim planom za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.700.000,00 EUR. U prvoj polovici 2023. godine sklopljen je ugovor o dugoročnom zaduživanju sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak u ukupnom iznosu od 3.981.684,25 EUR. U 2023. godini iskorišten je kredit u iznosu od 1.446.189,14 EUR, a namjena kredita su radovi na sanaciji javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora. Sukladno sklopljenom Ugovoru o javnoj nabavi za financirane radove, rok izvođenja je 15.06.2024. godine te će ostatak kredita biti evidentiran u 2024. godini sukladno izvršenim radovima.

Višak prihoda

II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu planirano je korištenje viška prihoda iz 2022. godine u iznosu od 118.540,15 EUR kojim su se financirali radovi redovitog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta.

Tablica 2. Rashodi i izdaci ostvareni u 2023. godini

| KONTO | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | REALIZIRANO | INDEKS |
|-----------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI | 16.707.297,55 | 15.779.971,99 | 94,45 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 12.679.980,16 | 12.354.756,06 | 97,44 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 421.877,82 | 415.983,54 | 98,60 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0,00 | 329.569,40 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 30.292,09 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0,00 | 56.122,05 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.576.207,90 | 11.341.704,40 | 97,97 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 17.305,80 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 26.797,03 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 11.226.451,77 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 71.149,80 | 0,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 132.559,39 | 102.180,37 | 77,08 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 0,00 | 55.613,14 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 46.567,23 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 530.891,23 | 490.774,48 | 92,44 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 490.774,48 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 18.443,82 | 4.113,27 | 22,30 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 4.113,27 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.761.871,77 | 3.159.829,13 | 84,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.808,91 | 7.083,79 | 80,42 |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 3.725,00 | 0,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 3.358,79 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.749.062,86 | 3.152.745,34 | 84,09 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 3.152.745,34 | 0,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova | 265.445,62 | 265.386,80 | 99,98 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 265.445,62 | 265.386,80 | 99,98 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 265.386,80 | 0,00 |

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirani su Financijskim planom za 2023. godinu u iznosu od 421.877,82 EUR, a izvršeni su u iznosu od 415.983,54 EUR.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju:

- Plaće za redovan rad u iznosu od 329.569,40 EUR. Rashodi se povećani u odnosu na prethodnu godinu zbog uvećanja osnovice plaće za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža te zbog zaposlenja jedne djelatnice.
- Plaće u naravi u iznosu od 2.769,95 EUR. Rashodi se obračunavaju po stvarno prijeđenim kilometrima u privatne svrhe (prijevoz na posao i s posla), a povećani su zbog povećanja naknade prema kojoj se utvrđuje vrijednost primitka u naravi sukladno Pravilniku o porezu na dohodak (Narodne novine' br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20, 1/21, 102/22, 112/22, 156/22, 1/23, 56/23, 143/23)
- Ostale rashode za zaposlene u iznosu od 30.292,09 EUR odnosno rashode za zaposlene temeljem Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i materijalnim pravima radnika u Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije i doprinose na plaće. U odnosu na 2022. godinu povećani su rashodi zbog isplate jubilarnih nagrada za tri zaposlenika, isplate potpore za novorođenčad jednom djelatniku te isplate naknade za troškove prehrane koje se u 2022. godini nisu isplaćivale.
- Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u iznosu od 56.122,05 EUR povećani su u skladu sa povećanjem plaće za redovan rad.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su Financijskim planom za 2023. godinu u iznosu od 11.576.207,90 EUR, a izvršeni su u iznosu od 11.341.704,40 EUR.

U okviru materijalnih rashoda vrijednosno su najznačajniji rashodi za usluge koje obuhvaćaju usluge tekućeg i investicijskog održavanja odnosno rashode za radove redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta. U usporedbi s 2022. godinom rashodi za održavanje cesta znatno su veći, a najviše zbog izvođenja radova na interventnoj sanaciji habajućih asfaltnih slojeva na županijskim i lokalnim cestama oštećenima u potresu na području Krapinsko-zagorske županije, a za koje je sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije te zbog izvođenja radova na sanaciji javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora koji se financiraju primljenim dugoročnim kreditom.

Materijalni rashodi obuhvaćaju:

- Naknade troškova zaposlenima - troškove na službenom putu, naknadu za troškove prijevoza na posao i s posla i troškove seminara i stručnog usavršavanja radnika.
- Rashode za materijal i energiju - troškove uredskog materijala, električne energije i goriva za službena vozila, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, sitnog inventara i auto guma i službene, radne i zaštitne odjeće i obuće.
- Rashode za usluge - troškove telefona i poštarine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja – radovi redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta, usluge promidžbe i informiranja (objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave, objave informacija na radio postajama i sl.), komunalne usluge (opskrba vodom, odvoz otpada i naknada za uređenje voda za županijske i lokalne ceste koja se plaća prema površini u m² posebno za kolnik i posebno za cestovni pojas), zakupnine i najamnine (najam licence programskog rješenja za upravljanje prometnom infrastrukturom – baza podataka o javnim cestama), intelektualne i osobne usluge (usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, usluge vještačenja i usluge obavljanja poslova zaštite na radu), računalne usluge (usluge održavanja računalnih programa i servera) i ostale usluge (usluga čišćenja poslovnih prostorija, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava i naknade Stanicama za tehnički pregled za obavljanje poslova naplate godišnje naknade za ceste što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila u ime Županijske uprave za ceste. Naknada je ugovorena u iznosu od 1,00 EUR sa PDV-om po registriranom vozilu).
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - naknade za rad upravnog vijeća, premije osiguranja (službena vozila, osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti), troškovi reprezentacije, članarine (Udruga Županijskih uprava za ceste), pristojbe i naknade (upravne pristojbe - biljezi, sudske pristojbe, javnobilježničke pristojbe).

Financijski rashodi

Financijski rashodi planirani su Financijskim planom za 2023. godinu u iznosu od 132.559,39 EUR, a izvršeni su u iznosu od 102.180,37 EUR.

Financijske rashodi obuhvaćaju:

- Kamate za primljene kredite i zajmove - troškove kamata po kreditu Privredne banke Zagreb s krajnjim rokom otplate 31.12.2027. godine te troškove interkalarnih kamata po kreditu Hrvatske banke za obnovu i razvitak odobrenom i korištenom u 2023. godini.
- *Ostale financijske rashode* - bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate i rashode za povrat godišnje naknade za uporabu javnih cesta invalidnim osobama temeljem članka 88. stavak 1. i 3. Zakona o cestama i vlasnicima objavljenih vozila temeljem članka 6. stavak 1. Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 130/2012) za razdoblje u kojem je, računajući od dana odjave vozila, prestala uporaba javnih cesta. Bankarske usluge i usluge platnog prometa veće su u odnosu na prethodnu godinu zbog troškova obrade kreditnog zahtjeva po sklopljenom Ugovoru o dugoročnom zaduživanju u 2023. godinu. Zatezne kamate u 2023. godini plaćene su temeljem pravomoćne sudske presude.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su Financijskim planom za 2023. godinu u iznosu od 530.891,23 EUR, a ostvarene su u iznosu od 490.774,48 EUR.

Pomoći se odnose na:

- doznaku sredstava Gradu Krapini sukladno članku 108. Zakona o cestama i odredbi Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila na osnovu kojih je propisano da se iz sredstava godišnje naknade za uporabu javnih cesta izdvaja dio sredstava gradovima s više od 35.000 stanovnika, te gradovima koji su sjedišta županija (veliki gradovi) za nerazvrstane ceste. Odredbama navedenog pravilnika propisani su udjeli velikih gradova u prihodu godišnje naknade za uporabu javnih cesta i on za Grad Krapinu iznosi 4,2 %.
- na sufinanciranje radova gradovima i općinama temeljem sklopljenih Sporazuma o sufinanciranju radova sukladno Pravilniku o sufinanciranju komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko-zagorske županije. Temeljem objavljenog javnog poziva, sklopljeno je sedam Ugovora o sufinanciranju radova za radove na izgradnji zatvorenog sustava odvodnje i pješačke staze, izgradnji zatvorenog sustava odvodnje ili pješačke staze ili izgradnji autobusnih ugibaldišta.

Ostali rashodi planirani su Financijskim planom za 2023. godinu u iznosu od 18.443,82 EUR, a ostvareni su u iznosu od 4.113,27 EUR.

Ostali rashodi odnose se na isplaćene naknade štete pravnim i fizičkim osobama pa pravomoćnim sudskim presudama te novčane kazne po prekršajnim prijavama MUP-a.

3. Prikaz radova građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta

Temeljem ostvarenih prihoda i Plana radova redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta kojeg je donijelo Upravno vijeće, izvedeni su radovi građenja i održavanja na županijskim i lokalnim cestama kako slijedi:

a) Izvedeni radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta

| POZICIJA | RADOVI | PLANIRANO | REALIZACIJA |
|----------|--|-------------------|-------------------|
| 1. | RADOVI REDOVITOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA | 11.180.171,90 EUR | 10.980.707,34 EUR |

Radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2023. godini planirani su u ukupnom iznosu 11.180.171,90 EUR, a realizirani su u ukupnoj vrijednosti 10.980.707,34 EUR. Tim radovima obuhvaćene su slijedeće skupine radova:

1.1. Radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta, kojim su obuhvaćeni radovi ljetnog i zimskog održavanja za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine - planirani su u ukupnom iznosu 3.172.418,18 EUR, a izvedeni u vrijednosti 3.164.383,84 EUR. Predmetni radovi su realizirani temeljem tri ugovora sklopljena temeljem okvirnog sporazuma. Prvi ugovor realiziran je u razdoblju od 01.01.2023. do 30.04.2023. godine u ukupnom iznosu 1.178.309,19 EUR, drugi ugovor u razdoblju od 01.05.2023. do 30.09.2023. godine u iznosu 1.432.115,45 EUR, te treći ugovor realiziran je u razdoblju od 01.10.2023. godine do 31.12.2023. godine u iznosu 553.959,26 EUR.

U tabličnom obliku prikazane su ukupne vrijednosti i udio u postocima pojedinih radova redovitog održavanja, odnosno u kojem su obimu pojedini radovi zastupljeni.

**IZVEDENI RADOVI REDOVITOG ODRŽAVANJA
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
u razdoblju od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine**

Tablica 1. Radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta u razdoblju 01.01.2023.-31.12.2023. godine

| Broj stavke | Naziv i opis stavke | Ukupno | Udio (%) |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|
| 1. | NADZOR I PREGLED CESTA I OBJEKATA | 37.105,68 EUR | 1,47% |
| 2. | ODRŽAVANJE PROMETNIH POVRŠINA | 21.558,95 EUR | 0,85% |
| 3. | ASFALJNI KOLNICI | 214.325,57 EUR | 8,47% |
| 4. | BANKINE | 102.583,67 EUR | 4,05% |
| 5. | POKOSI | 8.174,39 EUR | 0,32% |
| 6. | ODVODNJA | 389.455,22 EUR | 15,38% |
| 7. | PROMETNA SIGNALIZACIJA I OPREMA | 288.845,35 EUR | 11,41% |
| 8. | CESTOVNE NAPRAVE I UREĐAJI | - EUR | 0,00% |
| 9. | VEGETACIJA | 388.990,99 EUR | 15,37% |
| 10. | OSIGURANJE PREGLEDNOSTI | 629,34 EUR | 0,02% |
| 11. | CESTOVNI OBJEKTI | 4.745,80 EUR | 0,19% |
| 12. | INTERVENTNI RADOVI | 63.734,39 EUR | 2,52% |
| 13. | ZIMSKA SLUŽBA | 1.011.357,72 EUR | 39,95% |
| UKUPNO: | | 2.531.507,07 EUR | 100% |
| PDV 25%: | | 632.876,77 EUR | |
| SVEUKUPNO: | | 3.164.383,84 EUR | |

Prethodnom tablicom prikazan je pregled utrošenih sredstava po vrstama radova redovitog održavanja javnih cesta u postocima. Temeljem navedenog vidljivo je da troškovi održavanja županijskih i lokalnih cesta u zimskom razdoblju predstavlja značajan trošak, što čini 39,95% ukupno utrošenih sredstava za radove redovitog održavanja.

1.1.2. Sanacija pokosa i kanaliziranje oborinske odvodnje uz ŽC i LC, radovi navedeni u tablici 2., planirani su ukupnom iznosu od 80.000,00 EUR, a realizirani su u iznosu od 79.842,93 EUR. Ovim radovima izvršena je ugradnja cestovnih rubnjaka za vođenje površinskih oborinskih voda na kolnicima županijskih i lokalnih cesta. Na taj način sanirane su četiri lokacije na sljedećim javnim cestama; ŽC2093 Grletinec, Ž2096 Putkovec, Ž2127 Novi Golubovec i Gorjakovo ŽC2118.

Tablica 2. Sanacija pokosa i kanaliziranje oborinske odvodnje uz ŽC i LC

| Red. br. | Br. ceste | Kategorija ceste | Naziv dionice / naziv objekta | Vrsta planiranog zahvata | PLAN | IZVRŠENJE |
|----------------------------|--------------|------------------|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| 1.1.2.1. | Više ŽC i LC | III/IV | Više cesta na području KZŽ | Sanacija pokosa i kanaliziranje oborinske odvodnje uz ŽC i LC | 80.000,00 EUR | 79.842,93 EUR |
| UKUPNE VRIJEDNOSTI: | | | | | 80.000,00 EUR | 79.842,93 EUR |

1.1.3. Sanacija pukotina asfaltnog kolnika na ŽC i LC: radovi navedeni u tablici 3., planirani su ukupnom iznosu od 132.907,50 EUR, a realizirani su u iznosu od 132.907,50 EUR. Ovim radovima izvršena je sanacija pukotina asfaltnog kolnika na dvije županijske ceste; ŽC2248 i ŽC2219. Navedenim zahvatom sanirano je ukupno 21.995 m² pukotina.

Tablica 3. Sanacija pukotina asfaltnog kolnika na ŽC i LC

| Red. br. | Br. ceste | Kategorija ceste | Naziv dionice / naziv objekta | Vrsta planiranog zahvata | PLAN | IZVRŠENJE |
|----------------------------|--------------|------------------|-------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1.1.3.1. | Više ŽC i LC | III/IV | Više cesta na području KZŽ | Sanacija uzdužnih i poprečnih pukotina na županijskim i lokalnim cestama na području KZŽ | 132.907,50 EUR | 132.907,50 EUR |
| UKUPNE VRIJEDNOSTI: | | | | | 132.907,50 EUR | 132.907,50 EUR |

1.1.4. Radovi po kreditu: navedeni u tablici 4., Ovim programom predviđena je sanacija ukupno 58 dionica županijskih i lokalnih cesta, ukupne duljine 50,225 m, odnosno planira se ugradnja 231,391 m² habajućeg sloja od asfaltbetona AC 11 surf 50/70 AG3 M3. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 4.407.344,28 EUR, a planirani završetak realizacije je 15.06.2024. godine. Navedeni program financira se sredstvima iz kredita HBOR-a u ukupnom iznosu 3.981.684,25 EUR. Radovi započeti u jesen 2023. godine planirani su u iznosu od 1.700.000,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 1.551.208,50 EUR.

Tablica 4. Radovi po kreditu

| Red. br. | Br. ceste | Kategorija ceste | Naziv dionice / naziv objekta | Vrsta planiranog zahvata | PLAN | IZVRŠENJE |
|----------------------------|--------------|------------------|-------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 1.1.4.1. | Više ŽC i LC | III i IV | Područje KZŽ | Radovi na sanaciji javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora - po kreditu | 1.700.000,00 EUR | 1.551.208,50 EUR |
| UKUPNE VRIJEDNOSTI: | | | | | 1.700.000,00 EUR | 1.551.208,50 EUR |

1.1.5. Tehnološki nadzor nad radovima po kreditu: navedeni u tablici 5., planirani su ukupnom iznosu od 35.000,00 EUR, a realizirani su u iznosu od 9.347,50 EUR. Provedbom tehnološkog nadzora nad radovima interventne sanacije habajućih asfaltnih slojeva na ŽC i LC osigurano je postizanje potrebne kvalitete ugrađenih asfaltnih slojeva. Predmetnom uslugom prati se realizacija ugovora "Radovi na sanaciji javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora - po kreditu" sa predviđenim rokom završetka 15.06.2024. godine.

Tablica 5. Tehnološki nadzor nad radovima po kreditu

| Red. br. | Br. ceste | Kategorija ceste | Naziv dionice / naziv objekta | Vrsta planiranog zahvata | PLAN | IZVRŠENJE |
|----------------------------|--------------|------------------|-------------------------------|---|----------------------|---------------------|
| 1.1.5.1. | više ŽC i LC | III i IV | Više dionica | Tehnološki nadzor nad radovima sanacije habajućih asfaltnih slojeva | 35.000,00 EUR | 9.347,50 EUR |
| UKUPNE VRIJEDNOSTI: | | | | | 35.000,00 EUR | 9.347,50 EUR |

1.1.6. Sanacija habajućih asfaltnih slojeva na ŽC i LC; radovi navedeni u tablici 6., planirani su ukupnom iznosu od 196.043,58 EUR, a realizirani su u iznosu od 195.892,81 EUR. Ovim programom sanirano je ukupno 5 dionica županijskih i lokalnih cesta, ukupne duljine 4397 m, odnosno ugrađeno je ukupno 21.064,00 m² habajućeg sloja od asfaltbetona AC 11 surf 50/70 AG3 M3. Predmetni radovi ugovoreni su tijekom 2022. godine a završeni su u prvoj polovici 2023. godine.

Tablica 6. Sanacija habajućih asfaltnih slojeva na ŽC i LC - neizvršeni radovi temeljem Ugovora iz 2022.

| Red. br. | Br. ceste | Kategorija ceste | Naziv dionice / naziv objekta | Vrsta planiranog zahvata | PLAN | IZVRŠENJE |
|----------------------------|--------------|------------------|-------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1.1.6.1. | više ŽC i LC | III i IV | Više dionica ŽC i LC | Sanacija habajućih asfaltnih slojeva - neizvršeni radovi temeljem Ugovora iz 2022. godine | 196.043,58 EUR | 195.892,81 EUR |
| UKUPNE VRIJEDNOSTI: | | | | | 196.043,58 EUR | 195.892,81 EUR |

1.1.7. Uređenje oborinske odvodnje i postava cestovnih rubnjaka uz županijske i lokalne ceste; radovi navedeni u tablici 7., planirani su ukupnom iznosu od 80.000,00 EUR, a realizirani su u iznosu od 79.225,19 EUR. Ovim radovima izvršena je ugradnja cestovnih rubnjaka za vođenje površinskih oborinskih voda na kolnicima županijskih i lokalnih cesta, uređen je cestovni odvodni jarak PP/PE korugiranim cijevima uz izradu slivnika za prihvat površinskih oborinskih voda. Na taj način sanirana je dionica javne ceste ŽC2118 Gorjakovo.

Tablica 7. Uređenje oborinske odvodnje uz ŽC i LC postavom cestovnih rubnjaka

| Red. br. | Br. ceste | Kategorija ceste | Naziv dionice / naziv objekta | Vrsta planiranog zahvata | PLAN | IZVRŠENJE |
|----------------------------|--------------|------------------|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 1.1.7.1. | Više ŽC i LC | III/IV | Više cesta na području KZŽ | Uređenje oborinske odvodnje uz ŽC i LC postavom cestovnih rubnjaka | 80.000,00 EUR | 79.225,19 EUR |
| UKUPNE VRIJEDNOSTI: | | | | | 80.000,00 EUR | 79.225,19 EUR |

1.2.1. Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja na županijskim i lokalnim cestama: navedene usluge u tablici 8., planirane su ukupnom iznosu od 20.000,00 EUR, a realizirane su u iznosu od 15.385,63 EUR. Ova sredstva utrošena su za podmirenje troškova usluga iskolčenja instalacija od strane ovlaštenih javnopravnih tijela na više lokacija za potrebe izvođenja radova održavanja javnih cesta.

Tablica 8. Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja

| Red. br. | Br. ceste | Kategorija ceste | Naziv dionice / naziv objekta | Vrsta planiranog zahvata | PLAN | IZVRŠENJE |
|----------------------------|--------------|------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1.2.1.1. | Više ŽC i LC | III i IV | Područje KZŽ | Iskolčenja (HT, HEP, Plin i dr.) | 20.000,00 EUR | 15.385,63 EUR |
| UKUPNE VRIJEDNOSTI: | | | | | 20.000,00 EUR | 15.385,63 EUR |

1.2.2. Izrada projektne dokumentacije za radove izvanrednog održavanja ŽC i LC: navedene usluge u tablici 9., planirane su ukupnom iznosu od 66.486,80 EUR, a realizirane su u iznosu od 66.336,80 EUR. Ova sredstva utrošena su za izradu Elaborata interventne sanacije javnih cesta novim kolničkim zastorom. Snimkom stvarnog stanja izvršeno je evidentiranje županijskih i lokalnih cesta (LC22072, LC22023, ŽC2219 i ŽC2248) u duljini 18,07 km. Izrađen je projekt sanacije odrona za javne ceste ŽC2204, ŽC1006 i LC22017.

Tablica 9. Izrada projektne dokumentacije za radove izvanrednog održavanja ŽC i LC

| Red. br. | Br. ceste | Kategorija ceste | Naziv dionice / naziv objekta | Vrsta planiranog zahvata | PLAN | IZVRŠENJE |
|----------------------------|--------------|------------------|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| 1.2.2.1. | Više ŽC i LC | III i IV | Područje KZŽ | Elaborat interventne sanacije javnih cesta novim kolničkim zastorom | 26.211,80 EUR | 26.211,80 EUR |
| 1.2.2.2. | ŽC2204 | III | Poljanica Bistrička | Projekt sanacije odrona | 4.562,50 EUR | 4.562,50 EUR |
| 1.2.2.3. | ŽC1006 | IV | Podgorje Bistričko | Projekt sanacije odrona | 4.562,50 EUR | 4.562,50 EUR |
| 1.2.2.4. | Više ŽC i LC | III i IV | Područje KZŽ | Snimak stvarnog stanja | 26.500,00 EUR | 26.500,00 EUR |
| 1.2.2.5. | LC22017 | IV | Delkovec | Projekt sanacija odrona | 4.650,00 EUR | 4.500,00 EUR |
| UKUPNE VRIJEDNOSTI: | | | | | 66.486,80 EUR | 66.336,80 EUR |

1.2.3. Interventna sanacija habajućih asfaltnih slojeva na ŽC i LC; navedeni u tablici 10., planirani su ukupnom iznosu od 5.471.208,40 EUR, a realizirani su u iznosu od 5.471.208,40 EUR. Ovim programom sairano je ukupno 39 dionica županijskih i lokalnih cesta, ukupne duljine 59.814 m, odnosno ugrađeno je ukupno 267.201,00 m² habajućeg sloja od asfaltbetona AC 11 surf 50/70 AG3 M3. Radovi su sufinancirani u 100% iznosa iz Fonda solidarnosti Europske unije - vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih potresom.

Tablica 10. Interventna sanacija habajućih asfaltnih slojeva na ŽC i LC

| Red. br. | Br. ceste | Kategorija ceste | JLS/Naziv dionice | Vrsta planiranog zahvata | PLAN | IZVRŠENJE |
|----------------------------|--------------|------------------|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 1.2.3.1. | Više ŽC i LC | III i IV | Područje KZŽ | Interventna sanacija habajućih slojeva | 5.471.208,40 EUR | 5.471.208,40 EUR |
| UKUPNE VRIJEDNOSTI: | | | | | 5.471.208,40 EUR | 5.471.208,40 EUR |

1.2.4. Tehnološki nadzor nad radovima interventne sanacije kolnika; navedeni u tablici 11., planirani su ukupnom iznosu od 59.984,38 EUR, a realizirani su u iznosu od 59.984,39 EUR. Provedbom tehnološkog nadzora nad radovima interventne sanacija habajućih asfaltnih slojeva na ŽC i LC osigurano je postizanje potrebne kvalitete ugrađenih asfaltnih slojeva. Usluga je sufinancirana u 100% iznosu iz Fonda solidarnosti Europske unije - vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijavoza oštećenih potresom.

Tablica 11. Tehnološki nadzor nad radovima interventne sanacije kolnika

| Red. br. | Br. ceste | Kategorija ceste | Naziv dionice / naziv objekta | Vrsta planiranog zahvata | PLAN | IZVRŠENJE |
|----------------------------|--------------|------------------|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| 1.2.4.1. | više ŽC i LC | III i IV | Više dionica | Tehnološki i stručni nadzor nad radovima interventne sanacije habajućih asfaltnih slojeva | 59.984,38 EUR | 59.984,38 EUR |
| UKUPNE VRIJEDNOSTI: | | | | | 59.984,38 EUR | 59.984,38 EUR |

1.2.5. Radovi na sanaciji odrona; prikazani u tablici 12. planirani su u iznosu od 166.123,06 EUR, a realizirani su u iznosu od 154.983,85 EUR. Obuhvaćaju radove na sanaciji odrona na lokalnim cestama u mjestu Klokovec, Stari Golubovec i Goljak Klanječki. Radovi na sanaciji odrona Goljak Klanječki na lokalnoj cesti LC22031 ugovoreni su krajem 2022. godine te su uspješno realizirani tijekom 2023. godine.

Tablica 12. Sanacija odrona na ŽC i LC

| Red. br. | Br. ceste | Kategorija ceste | Naziv dionice / naziv objekta | Vrsta planiranog zahvata | PLAN | IZVRŠENJE |
|----------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1.2.5.1. | LC22082 | III | Klokovec | Sanacija odrona | 74.905,00 EUR | 74.750,81 EUR |
| 1.2.5.2. | LC22016 | IV | Stari Golubovec | Sanacija odrona | 59.725,26 EUR | 51.306,48 EUR |
| 1.2.5.3. | LC22031 | IV | Goljak Klanječki | Sanacija odrona * postupak nabave pokrenut krajem 2022. | 31.492,80 EUR | 28.926,56 EUR |
| UKUPNE VRIJEDNOSTI: | | | | | 166.123,06 EUR | 154.983,85 EUR |

2. DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA/CESTAMA - REKONSTRUKCIJA I GRADNJA

3.749.062,86 EUR

3.152.745,34 EUR

2.1. Planirani kapitalni projekti - rekonstrukcija/sanacija klizišta

1.394.441,97 EUR

1.268.718,20 EUR

2.1.1. Radovi na rekonstrukciji/sanaciji klizišta; navedeni u tablici 13., planirani su ukupnom iznosu od 1.194.826,89 EUR, a realizirani su u iznosu od 1.112.011,89 EUR. Svi zahvati su uspješno realizirani. Radovi na sanaciji klizišta Gorjani Sutinski i Putkovec su sufinancirani u 100% iznosu iz Fonda solidarnosti Europske unije-vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona oštećenih u potresu. Radovi na sanaciji klizišta Hršak Breg na ŽC2155 sufinancirani su od strane Hrvatskih voda.

Tablica 13. Radovi na /rekonstrukciji/sanaciji klizišta

| Red. br. | Br. ceste | Kategorija ceste | Naziv dionice / naziv objekta | Vrsta planiranog zahvata | PLAN | IZVRŠENJE |
|----------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 2.1.1.1. | LC22089 | IV | Gorjani Sutinski | Sanacija klizišta | 236.609,24 EUR | 236.609,24 EUR |
| 2.1.1.2. | ŽC2096 | III | Putkovec | Sanacija klizišta * postupak nabave proveden krajem 2022. godine | 190.502,65 EUR | 190.502,65 EUR |
| 2.1.1.3. | ŽC2151 | III | Sopot | Sanacija klizišta | 300.000,00 EUR | 233.619,39 EUR |
| 2.1.1.4. | ŽC2155 | III | Hršak Breg | Sanacija klizišta | 100.000,00 EUR | 99.327,53 EUR |
| 2.1.1.5. | ŽC2221 | III | Globočec - Kožiči | Sanacija klizišta | 237.715,00 EUR | 237.193,50 EUR |
| 2.1.1.6. | LC22008 | IV | Orešje Humsko | Sanacija klizišta | 130.000,00 EUR | 114.759,58 EUR |
| UKUPNE VRIJEDNOSTI: | | | | | 1.194.826,89 EUR | 1.112.011,89 EUR |

2.1.2. Stručni, tehnološki i geodetski nadzor na projektima - rekonstrukcije/sanacije klizišta; navedeni u tablici 14., planirani su ukupnom iznosu od 51.893,12 EUR, a realizirani su u iznosu od 37.319,37 EUR. Svi zahvati pružanja usluga stručnog nadzora uspješno su izvršeni.

Tablica 14. Stručni, tehnološki i geodetski nadzor na projektima - rekonstrukcije/sanacije klizišta

| Red. br. | Br. ceste | Kategorija ceste | Naziv dionice / naziv objekta | Vrsta planiranog zahvata | PLAN | IZVRŠENJE |
|----------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 2.1.2.1. | LC22089 | IV | Gorjani Sutinski | Stručni nadzor nad radovima sanacije klizišta | 5.462,50 EUR | 5.462,50 EUR |
| 2.1.2.2. | ŽC2096 | III | Putkovec | Stručni nadzor nad radovima sanacije klizišta *postupak nabave proveden krajem 2022. | 9.930,62 EUR | 9.930,62 EUR |
| 2.1.2.3. | ŽC2151 | III | Sopot | Stručni nadzor nad radovima sanacije klizišta | 12.500,00 EUR | 5.731,25 EUR |
| 2.1.2.4. | ŽC2155 | III | Hršak Breg | Stručni nadzor nad radovima sanacije klizišta | 5.000,00 EUR | 3.350,00 EUR |
| 2.1.2.5. | ŽC2221 | III | Globočec - Kozici | Stručni nadzor nad radovima sanacije klizišta | 12.500,00 EUR | 7.480,00 EUR |
| 2.1.2.6. | LC22008 | IV | Orešje Humsko | Stručni nadzor nad radovima sanacije klizišta | 6.500,00 EUR | 5.365,00 EUR |
| UKUPNE VRIJEDNOSTI: | | | | | 51.893,12 EUR | 37.319,37 EUR |

2.1.3. Izrada projektne dokumentacije za radove rekonstrukcije/sanacije klizišta ŽC i LC; planirano je u vrijednosti od 147.721,96 EUR, a realizirano je u vrijednosti od 119.386,94 EUR. Projekti sanacije klizišta Velika Horvatska na ŽC2248 i Prigorje na ŽC2096 te projekt sanacije odrona i ceste Zlatar na LC22053 ugovoreni su krajem 2023. godine, s rokom završetka u prvom kvartalu 2024. godine. Izradom projektne dokumentacije obuhvaćena je potrebna dokumentacija za radove na sanaciji i rekonstrukciji klizišta na županijskim i lokalnim cestama. Projekt sanacije odrona/pokosa Pregrada Vrhi nije ugovoren.

Tablica 15. Izrada projektne dokumentacije za radove rekonstrukcije/sanacije klizišta ŽC i LC

| Red. br. | Br. ceste | Kategorija ceste | Naziv dionice / naziv objekta | Vrsta planiranog zahvata | PLAN | IZVRŠENJE |
|----------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 2.1.3.1. | ŽC2171 | III | Hrašćina | Projekt sanacije klizišta | 9.350,00 EUR | 9.350,00 EUR |
| 2.1.3.2. | ŽC2241 | III | Kladnik | Projekt sanacije klizišta | 8.300,00 EUR | 8.300,00 EUR |
| 2.1.3.3. | ŽC2198 | IV | Hruševac | Projekt sanacije klizišta | 8.300,00 EUR | 8.300,00 EUR |
| 2.1.3.4. | ŽC2120 | III | Stara Ves | Projekt sanacije klizišta | 8.300,00 EUR | 8.250,00 EUR |
| 2.1.3.5. | LC22007 | IV | Vinagora | Projekt sanacije klizišta | 8.300,00 EUR | 8.050,00 EUR |
| 2.1.3.6. | ŽC2248 | III | Velika Horvatska | Projekt sanacije klizišta | 8.300,00 EUR | 0,00 EUR |
| 2.1.3.8. | ŽC2257 | IV | Gorjani Sutinski | Projekt sanacije pokosa | 8.300,00 EUR | 7.500,00 EUR |
| 2.1.3.9. | ŽC2151 | III | Pregrada Vrhi | Projekt sanacije odrona/pokosa | 9.290,00 EUR | 0,00 EUR |
| 2.1.3.10. | LC22008 | IV | Orešje Humsko | Projekt sanacije klizišta | 8.237,50 EUR | 8.112,50 EUR |
| 2.1.3.11. | ŽC2169 | IV | Gornja Selnica | Projekt sanacije klizišta | 10.620,00 EUR | 17.250,00 EUR |
| 2.1.3.12. | LC22089 | IV | Gorjani Sutinski | Projekt sanacije klizišta - neizvršeni radovi temeljem ugovora iz 2022. godine | 9.174,46 EUR | 9.174,44 EUR |
| 2.1.3.13. | ŽC2151 | III | Sopot | Projekt sanacije klizišta | 9.225,00 EUR | 9.225,00 EUR |
| 2.1.3.14. | ŽC2155 | III | Hršak Breg | Projekt sanacije klizišta | 8.225,00 EUR | 8.100,00 EUR |
| 2.1.3.15. | ŽC2221 | III | Globočec - Kožići | Projekt sanacije klizišta | 11.500,00 EUR | 11.500,00 EUR |
| 2.1.3.16. | ŽC2096 | III | Prigorje | Projekt sanacije klizišta | 9.300,00 EUR | 0,00 EUR |
| 2.1.3.17. | LC22053 | III | Zlatar | Projekt sanacije odrona i ceste | 13.000,00 EUR | 6.275,00 EUR |
| UKUPNE VRIJEDNOSTI: | | | | | 147.721,96 EUR | 119.386,94 EUR |

2.2. Planirani kapitalni projekti - rekonstrukcija/izgradnja cesta

608.490,00 EUR

539.772,22 EUR

2.2.1. Radovi na rekonstrukciji/izgradnji cesta; navedeni u tablici 16., planirani su ukupnom iznosu od 593.225,00 EUR, a realizirani su u iznosu od 531.987,28 EUR. Radovi na zahvatu izgradnje kružnog raskrižja i rekonstrukcije ceste Radoboj na Ž2122 ugovoreni su tijekom 2023. godine s rokom završetka radova 30.03.2024. godine. Ostali zahvati realizirani su tijekom 2023. godine.

Tablica 16. Radovi na rekonstrukciji/izgradnji cesta

| Red. br. | Br. ceste | Kategorija ceste | Naziv dionice / naziv objekta | Vrsta planiranog zahvata | PLAN | IZVRŠENJE |
|----------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 2.2.1.2. | ŽC2128 | III | Lobor - Buntaki | Rekonstrukcija ceste | 159.270,00 EUR | 192.083,59 EUR |
| 2.2.1.3. | ŽC2122 | III | Radoboj | Izgradnja kružnog raskrižja i rekonstrukcija ceste | 92.905,00 EUR | 0,00 EUR |
| 2.2.1.4. | ŽC2155 | III | Mihanovićeve ulica | Rekonstrukcija ceste | 267.281,25 EUR | 267.028,74 EUR |
| 2.2.1.5. | ŽC2128 | III | Lobor - Buntaki | Rekonstrukcija ceste - neizvršeni radovi temeljem Ugovora iz 2022. | 41.710,35 EUR | 40.886,80 EUR |
| 2.2.1.6. | ŽC2122 | III | Radoboj | Izgradnja kružnog raskrižja i rekonstrukcija ceste - neizvršeni radovi temeljem Ugovora iz 2022. | 32.058,40 EUR | 31.988,15 EUR |
| UKUPNE VRIJEDNOSTI: | | | | | 593.225,00 EUR | 531.987,28 EUR |

2.2.2. Stručni, tehnološki i geodetski nadzor na projektima - rekonstrukcija/izgradnja cesta; navedeni u tablici 17., planirani su u ukupnom iznosu od 15.265,00 EUR a realizirani su u ukupnom iznosu 7.784,94 EUR. Usluge stručnog nadzora ugovorene su za praćenje radova na rekonstrukciji ceste. Stručni nadzor nad radovima na Ž2122 Radoboj izvršen je od strane ovlaštenih djelatnika ove Uprave, te nije ugovoren od strane vanjskih suradnika.

Tablica 17. Stručni, tehnološki i geodetski nadzor na projektima - rekonstrukcija/izgradnja cesta

| Red. br. | Br. ceste | Kategorija ceste | Naziv dionice / naziv objekta | Vrsta planiranog zahvata | PLAN | IZVRŠENJE |
|----------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|
| 2.2.2.3. | ŽC2122 | III | Radoboj | Stručni nadzor | 5.310,00 EUR | 0,00 EUR |
| 2.2.2.4. | ŽC2155 | III | Mihanovićeve ulica | Stručni nadzor | 9.955,00 EUR | 7.784,94 EUR |
| UKUPNE VRIJEDNOSTI: | | | | | 15.265,00 EUR | 7.784,94 EUR |

2.3.1. Radovi na rekonstrukciji/sanaciji propusta i mostova; navedeni u tablici 18., planirani su ukupnom iznosu od 1.621.210,37 EUR, a realizirani su u iznosu od 1.286.210,40 EUR. Radovi na zahvatu izgradnje mosta Donja Stubica-Jezerčica na L22106 ugovoreni su tijekom 2023. godine s rokom realizacije u prvoj polovici 2024. godine. Ostali zahvati realizirani su tijekom 2023. godine te su sufinancirani iz Fonda solidarnosti Europske unije - vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona oštećenih u potresu. Sufinanciranje je izvršeno u omjeru 80% FSEU te 20% ŽUC.

Tablica 18. Radovi na rekonstrukciji/sanaciji propusta i mostova

| Red. br. | Br. ceste | Kategorija ceste | Naziv dionice / naziv objekta | Vrsta planiranog zahvata | PLAN | IZVRŠENJE |
|----------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 2.3.1.1. | LC22078 | IV | Selnica | Radovi na sanaciji propusta | 140.854,35 EUR | 140.854,36 EUR |
| 2.3.1.2. | ŽC2200 | III | Donja Stubica | Radovi na sanaciji mosta | 352.126,04 EUR | 352.126,05 EUR |
| 2.3.1.3. | ŽC2126 | III | Velika Petrovagorska | Radovi na sanaciji propusta | 151.477,11 EUR | 151.477,11 EUR |
| 2.3.1.4. | ŽC2248 | III | Šimunci | Radovi na sanaciji propusta | 287.991,55 EUR | 287.991,55 EUR |
| 2.3.1.5. | ŽC2224 | III | Sveti Matej | Radovi na sanaciji propusta | 206.441,34 EUR | 206.441,34 EUR |
| 2.3.1.6. | ŽC2125 | III | Velika Reka | Radovi na sanaciji propusta * postupak nabave pokrenut krajem 2022. | 147.319,98 EUR | 147.319,99 EUR |
| 2.3.1.7. | LC22106 | IV | Donja Stubica - Jezerčica | Radovi na izgradnji mosta | 335.000,00 EUR | 0,00 EUR |
| UKUPNE VRIJEDNOSTI: | | | | | 1.621.210,37 EUR | 1.286.210,40 EUR |

2.3.2. Stručni, tehnološki i geodetski nadzor na projektima - rekonstrukcija/sanacija propusta i mostova; navedena u tablici 19., planirana je u ukupnom iznosu od 61.289,27 EUR a realizirana je u ukupnom iznosu od 47.788,27 EUR. Usluge vanjskog stručnog nadzora ugovorene su za praćenje radova sanacije propusta i mostova. Svi zahvati pružanja usluga stručnog nadzora završeni su u 2023. godini osim usluge nadzora na zahvatu izgradnje mosta Donja Stubica-Jezerčica koja je ugovorena tijekom 2023. godine s rokom realizacije u 2024. godine.

Tablica 19. Stručni, tehnološki i geodetski nadzor na projektima - rekonstrukcija/sanacija propusta i mostova

| Red. br. | Br. ceste | Kategorija ceste | Naziv dionice / naziv objekta | Vrsta planiranog zahvata | PLAN | IZVRŠENJE |
|----------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 2.3.2.1. | LC22078 | IV | Selnica | Stručni nadzor na sanaciji propusta | 6.248,63 EUR | 6.248,63 EUR |
| 2.3.2.2. | ŽC2200 | III | Donja Stubica | Stručni nadzor na sanaciji mosta | 10.500,00 EUR | 10.500,00 EUR |
| 2.3.2.3. | ŽC2126 | III | Velika Petrovagorska | Stručni nadzor na sanaciji propusta | 8.925,00 EUR | 8.925,00 EUR |
| 2.3.2.4. | ŽC2248 | III | Šimunci | Stručni nadzor na sanaciji propusta | 10.850,00 EUR | 10.850,00 EUR |
| 2.3.2.5. | ŽC2224 | III | Sveti Matej | Stručni nadzor na sanaciji propusta | 6.622,50 EUR | 6.622,50 EUR |
| 2.3.2.6. | ŽC2125 | III | Velika Reka | Stručni nadzor na sanaciji propusta * postupak nabave pokrenut krajem 2022 | 4.643,14 EUR | 4.642,14 EUR |
| 2.3.2.7. | LC22106 | III | Donja Stubica - Jezerčica | Stručni nadzor na izgradnji mosta | 13.500,00 EUR | 0,00 EUR |
| UKUPNE VRIJEDNOSTI: | | | | | 61.289,27 EUR | 47.788,27 EUR |

2.3.3. Izrada projektne dokumentacije za radove rekonstrukcije/sanacije propusta i mostova; navedena u tablici 20., planirana je u vrijednosti od 66.631,25 EUR, a realizirana je do kraja 2023 godine u vrijednosti od 10.256,25 EUR. Izradom projektne dokumentacije obuhvaćena je potrebna dokumentacija za rekonstrukciju/sanacije propusta na županijskim i lokalnim cestama. Ukupno je ugovorena izrada 5 zasebnih projekata krajem 2023. godine s rokom realizacije u prvoj polovici 2024. godine. Projekti rekonstrukcije propusta na Ž2258 Gornji Macelj i ŽC2125 Sutinske Toplice nisu ugovoreni tijekom 2023. godine.

Tablica 20. Izrada projektne dokumentacije za radove rekonstrukcije/sanacije propusta i mostova

| Red. br. | Br. ceste | Kategorija ceste | Naziv dionice / naziv objekta | Vrsta planiranog zahvata | PLAN | IZVRŠENJE |
|----------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 2.3.3.1. | ŽC2221 | III | Globočec | Projekt rekonstrukcije propusta | 9.500,00 EUR | 0,00 EUR |
| 2.3.3.2. | ŽC2151 | III | Miljana | Projekt rekonstrukcije propusta | 9.500,00 EUR | 0,00 EUR |
| 2.3.3.3. | ŽC2218 | IV | Pregrada | Projekt rekonstrukcije propusta | 9.500,00 EUR | 3.625,00 EUR |
| 2.3.3.4. | ŽC2217 | III | Stipernica | Projekt rekonstrukcije propusta | 9.500,00 EUR | 0,00 EUR |
| 2.3.3.5. | ŽC2258 | III | Gornji Macelj | Projekt rekonstrukcije propusta | 9.500,00 EUR | 0,00 EUR |
| 2.3.3.6. | LC22001 | IV | Gornji Macelj | Projekt rekonstrukcije propusta * postupak nabave pokrenut 2022. | 6.631,25 EUR | 6.631,25 EUR |
| 2.3.3.7. | ŽC2125 | IV | Sutinske | Projekt rekonstrukcije propusta | 9.500,00 EUR | 0,00 EUR |
| UKUPNE VRIJEDNOSTI: | | | | | 63.631,25 EUR | 10.256,25 EUR |

3.1. Županijskoj upravi za ceste KZŽ, temeljem Odluke o razvrstavanju javnih cesta (NN 59/23) i Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (NN 44/12) određena je prekategorizacija ukupno 28,79 km županijskih i lokalnih cesta u nerazvrstane ceste na području grada Krapine. Održavanje tih cesta vrši se sredstvima iz proračuna grada Krapine i sufinanciranja od strane Županijske uprave za ceste, temeljem članka 108. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 41/23 i 133/23). Tijekom 2023. godine Županijska uprava za ceste je sufinancirala održavanje navedenih cesta u ukupnom iznosu od 232.148,16 EUR.

4.1. Sufinanciranje radova gradovima i općinama; planirano je u vrijednosti od 298.626,32 EUR, a realizirano je u vrijednosti od 258.626,32 kn. Tijekom 2023. godine ova Uprava za ceste temeljem Javnog poziva za sufinanciranja radova komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste sufinancirale je zahvate kojima su nositelji bili jedinice lokalne samuprave.

Tablica 22. Sufinanciranje radova komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste

| Red. br. | Br. ceste | Kategorija ceste | JLS/Naziv dionice | Vrsta planiranog zahvata | PLAN | IZVRŠENJE |
|----------------------------|-----------|------------------|----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 4.1.1. | ŽC2169 | IV | GRAD ZLATAR | Izvođenje radova uredenja nogostupa i oborinske kanalizacije-Varaždinska ulica – Faza 4 | 298.626,32 EUR | 50.000,00 EUR |
| | ŽC2189 | IV | GRAD ZABOK | Izgradnja nogostupa i oborinske odvodnje, Martinišće | | 29.313,16 EUR |
| | ŽC2162 | IV | OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE | Rekonstrukcija ceste i izgradnja nogostupa u naselju Sekirišće | | 60.000,00 EUR |
| | LC22076 | IV | GRAD DONJA STUBICA | Izgradnja nogostupa u Dubrovačkoj ulici - Faza 3 | | 24.313,16 EUR |
| | ŽC2125 | IV | OPĆINA MIHOVLJAN | Izgradnja nogostupa i oborinske odvodnje, Mihovljan | | 35.000,00 EUR |
| | ŽC2217 | III | GRAD OROSLAVJE | Pješačka staza i odvodnja, Krušljevo Selo | | 60.000,00 EUR |
| UKUPNE VRIJEDNOSTI: | | | | | 298.626,32 EUR | 258.626,32 EUR |

**IZVRŠENJE PLANA GRAĐENJA
I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE U 2023. GODINI**

| Redni broj | | PLAN | IZVRŠENJE |
|---------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Planirani radovi održavanja županijskih i lokalnih cesta | 11.180.171,90 EUR | 10.980.707,34 EUR |
| 2. | Planirana dodatna ulaganja na građevinskim objektima/cestama - rekonstrukcija i gradnja | 3.749.062,86 EUR | 3.152.745,34 EUR |
| 3. | Grad Krapina - financiranje nerazvrstanih cesta | 232.264,91 EUR | 232.148,16 EUR |
| 4. | Sufinanciranje radova gradovima i općinama | 298.626,32 EUR | 258.626,32 EUR |
| UKUPNO | | 15.460.125,99 EUR | 14.624.227,16 EUR |

Sukladno članku 12. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije, Upravno vijeće donosi Plan održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta, na prijedlog ravnatelja Uprave za ceste.

Zakonom o javnoj nabavi (NN120/16, 114/22), odnosno člankom 307. stavak 4. istog Zakona propisano je: ako javni naručitelj za preuzimanje obveza mora imati suglasnost drugog tijela, smatra se da je ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum sklopljen na dan pribavljanja suglasnosti

Prije sklapanja ugovora ili izdavanja narudžbenice za svaku stavku plana radova koja prelazi iznos ovlaštenja Ravnatelja iz čl. 17. Statuta KZŽ, potrebna je suglasnost Upravnog vijeća, stoga se istovremeno sa usvajanjem plana radova istodobno daje suglasnost Ravnatelju uprave za sklapanje ugovora o javnoj nabavi, odnosno okvirnog sporazuma, ili izdavanja narudžbenice za nabavu roba, usluga ili radova koje su navedene u planu nabave.

Ravnatelj:

Stjepan Sirovec, mag.ing.traff.

Klasa: 001-02/24-01/01
Urbroj: 2140-35-03/1-24-1
Pregrada, 28.03.2024.

Predsjednik Upravnog vijeća
Županijske uprave za ceste
Nikola Boromisa, struč.spec.ing.aedif




PRILOG 1

**PRIKAZ DULJINA KOLNIKA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
RASPODIJELJENIH PO GRADOVIMA I OPĆINAMA**

| Grad/Općina | Duljina županijskih cesta | Duljina lokanih cesta | Duljina cesta ukupno |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| GRAD DONJA STUBICA | 12,101 | 6,393 | 18,494 |
| GRAD KLANJEC | 10,286 | 9,229 | 19,515 |
| GRAD OROSLAVJE | 11,064 | 5,779 | 16,843 |
| GRAD PREGRADA | 31,156 | 6,845 | 38,001 |
| GRAD ZABOK | 25,867 | 4,364 | 30,231 |
| GRAD ZLATAR | 24,966 | 17,511 | 42,477 |
| OPĆINA BEDEKOVČINA | 38,128 | 2,310 | 40,438 |
| OPĆINA BUDINŠČINA | 10,603 | 7,258 | 17,861 |
| OPĆINA DESINIĆ | 21,074 | 8,480 | 29,554 |
| OPĆINA ĐURMANEC | 6,612 | 11,215 | 17,827 |
| OPĆINA GORNJA STUBICA | 20,709 | 6,448 | 27,157 |
| OPĆINA HRAŠČINA | 9,276 | 11,060 | 20,336 |
| OPĆINA HUM NA SUTLI | 8,637 | 8,192 | 16,829 |
| OPĆINA JESENJE | 0,000 | 5,724 | 5,724 |
| OPĆINA KONJŠČINA | 8,177 | 20,166 | 28,343 |
| OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI | 14,992 | 6,891 | 21,883 |
| OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE | 14,788 | 19,227 | 34,015 |
| OPĆINA KUMROVEC | 6,549 | 5,768 | 12,317 |
| OPĆINA LOBOR | 9,954 | 8,312 | 18,266 |
| OPĆINA MAČE | 8,457 | 2,227 | 10,684 |
| OPĆINA MARIJA BISTRICA | 17,963 | 8,236 | 26,199 |
| OPĆINA MIHOVLJAN | 11,625 | 0,863 | 12,488 |
| OPĆINA NOVI GOLUBOVEC | 4,736 | 3,027 | 7,763 |
| OPĆINA PETROVSKO | 6,810 | 1,632 | 8,442 |
| OPĆINA RADOBOJ | 14,070 | 9,240 | 23,310 |
| OPĆINA STUBIČKE TOPLICE | 18,319 | 0,000 | 18,319 |
| OPĆINA SV. KRIŽ ZAČRETJE | 24,215 | 2,297 | 26,512 |
| OPĆINA TUHELJ | 9,726 | 6,979 | 16,705 |
| OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE | 18,575 | 25,121 | 43,696 |
| OPĆINA ZAGORSKA SELA | 1,826 | 6,204 | 8,030 |
| OPĆINA ZLATAR BISTRICA | 2,745 | 10,324 | 13,069 |
| Ukupno km | 424,006 | 247,322 | 671,328 |

Duljina kolnika županijskih i lokanih cesta po gradovima i općinama

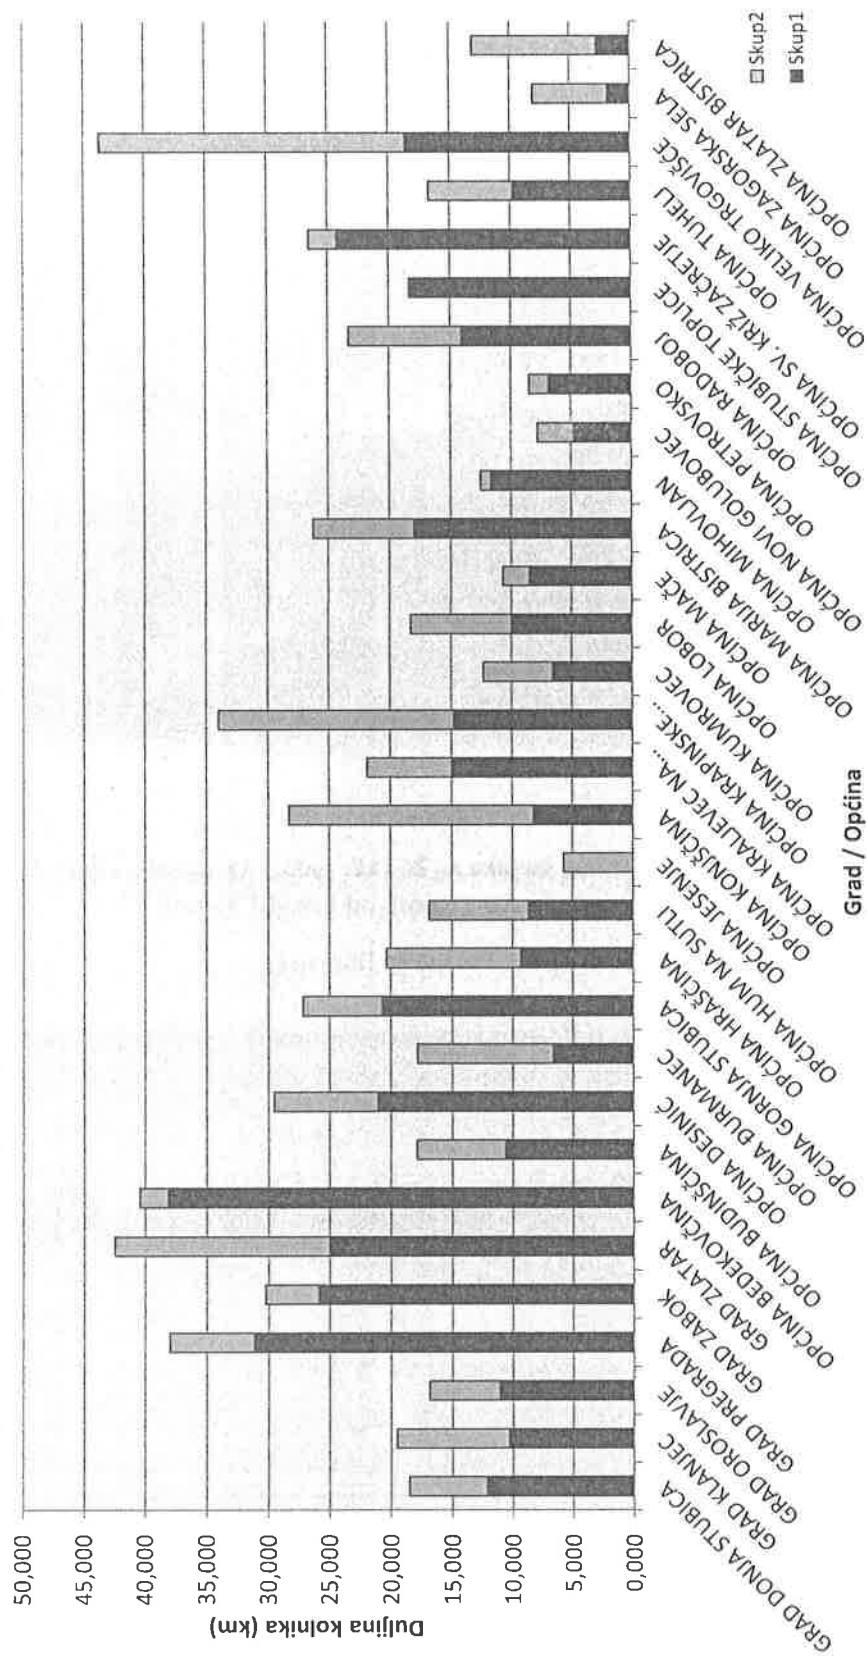


FOTOGRAFIJE IZVEDENIH RADOVA REDOVITOG I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA

2023. GODINE


1.1.2. Sanacija pokosa i kanaliziranje oborinske odvodnje uz ŽC i LC, radovi navedeni u tablici 2., planirani su ukupnom iznosu od 80.000,00 EUR, a realizirani su u iznosu od 79.842,93 EUR.

1.1.2.1. Radovi sanacija pokosa i kanaliziranje oborinske odvodnje uz županijsku cestu ŽC2118 Gorjakovo

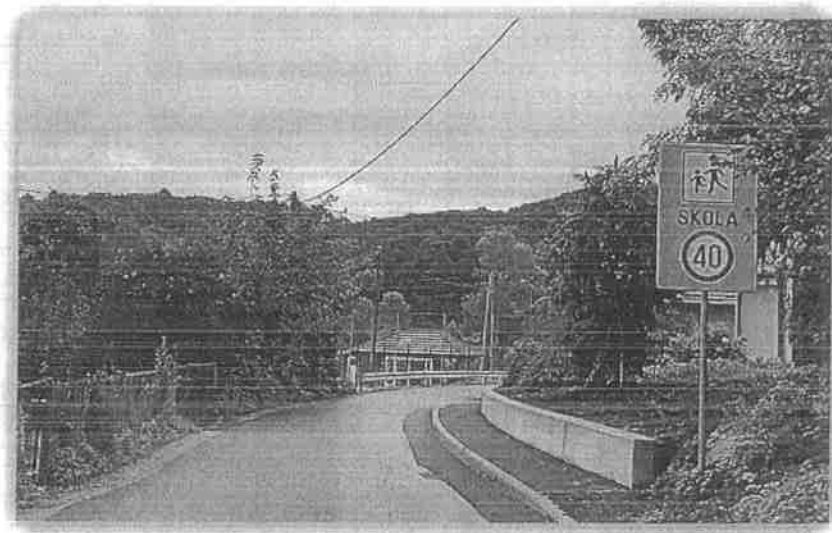

1.1.3. Sanacija pukotina asfaltnog kolnika na ŽC i LC: radovi navedeni u tablici 3., planirani su ukupnom iznosu od 132.907,50 EUR, a realizirani su u iznosu od 132.907,50 EUR.

1.1.3.1. Radovi na sanaciji pukotina – Ž2248 Velika Horvatska

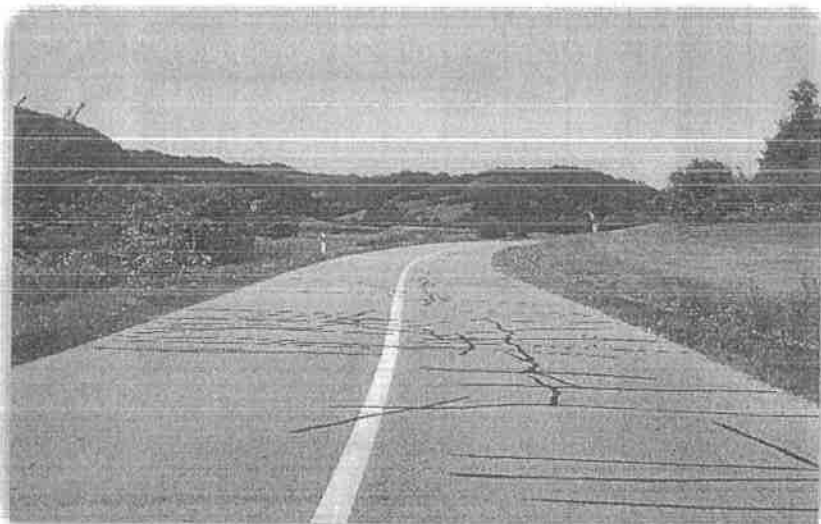

1.1.4. Radovi po kreditu HBOR: navedeni u tablici 4., Ovim programom predviđena je sanacija ukupno 58 dionica županijskih i lokalnih cesta, ukupne duljine 50.225 m, odnosno planira se ugradnja 231.391 m² habajućeg sloja od asfaltbetona AC 11 surf 50/70 AG3 M3. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 4.407.344,28 EUR, a planirani završetak realizacije je 15.06.2024. godine.

1.1.4.1. Radovi na sanaciji županijske ceste ŽC2125 Mače



1.1.6. Sanacija habajućih asfaltnih slojeva na ŽC i LC; radovi navedeni u tablici 6., planirani su ukupnom iznosu od 196.043,58 EUR, a realizirani su u iznosu od 195.892,81 EUR. Ovim programom sanirano je ukupno 5 dionica županijskih i lokalnih cesta, ukupne duljine 4397 m, odnosno ugrađeno je ukupno 21.064,00 m² habajućeg sloja od asfaltbetona AC 11 surf 50/70 AG3 M3.

1.1.6.1. Radovi na sanaciji lokalne ceste LC22024 Vrtnjakovec




1.1.7. Uređenje oborinske odvodnje i postava cestovnih rubnjaka uz županijske i lokalne ceste; radovi navedeni u tablici 7., planirani su ukupnom iznosu od 80.000,00 EUR, a realizirani su u iznosu od 79.225,19 EUR. Ovim radovima izvršena je ugradnja cestovnih rubnjaka za vođenje površinskih oborinskih voda na kolnicima županijskih i lokalnih cesta.

1.1.7.1. Radovi na uređenju oborinske odvodnje i postava cestovnih rubnjaka uz županijsku cestu Ž2118 Gorjakovo



1.2.3. Interventna sanacija habajućih asfaltnih slojeva na ŽC i LC; navedeni u tablici 10., planirani su ukupnom iznosu od 5.471.208,40 EUR, a realizirani su u iznosu od 5.471.208,40 EUR. Ovim programom sairano je ukupno 39 dionica županijskih i lokalnih cesta, ukupne duljine 59.814 m, odnosno ugrađeno je ukupno 267.201,00 m² habajućeg sloja od asfaltbetona AC 11 surf 50/70 AG3 M3. Radovi su sufinancirani u 100% iznosa iz Fonda solidarnosti Europske unije - vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih potresom.

1.2.3.1. Radovi na sanaciji habajućih asfaltnih slojeva na županijskoj cesti ŽC2122 Radoboj

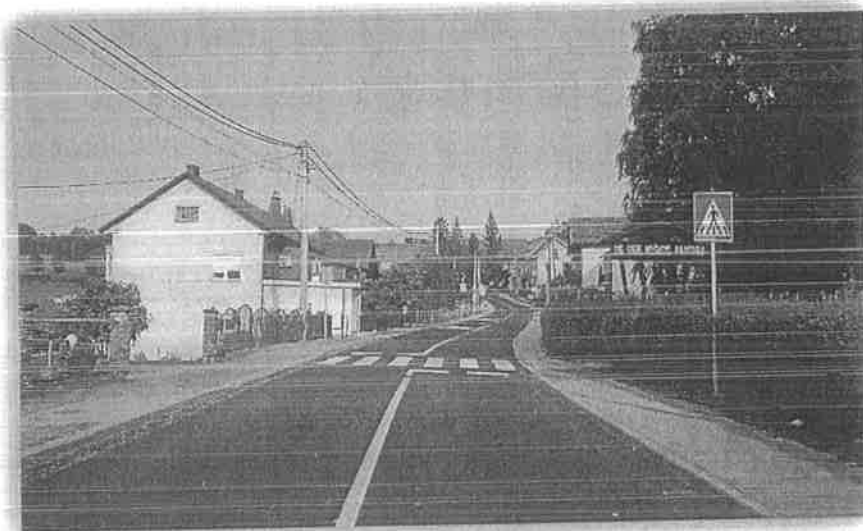

1.2.5. Radovi na sanaciji odrona; prikazani u tablici 12. planirani su u iznosu od 166.123,06 EUR, a realizirani su u iznosu od 154.983,85 EUR. Obuhvaćaju radove na sanaciji odrona na lokalnim cestama u mjestu Klokovec, Stari Golubovec i Goljak Klanječki. Radovi na sanaciji odrona Goljak Klanječki na lokalnoj cesti LC22031 ugovoreni su krajem 2022. godine te su uspješno realizirani tijekom 2023. godine.

1.2.5.1. Radovi na sanaciji odrona – LC22082 Klokovec



1.2.5.2. Radovi na sanaciji odrona – LC22016 Stari Golubovec




2.1.1. Radovi na rekonstrukciji/sanaciji klizišta; navedeni u tablici 13., planirani su ukupnom iznosu od 1.194.826,89 EUR, a realizirani su u iznosu od 1.112.011,89 EUR. Svi zahvati su uspješno realizirani. Radovi na sanaciji klizišta Gorjani Sutinski i Putkovec su sufinancirani u 100% iznosu iz Fonda solidarnosti Europske unije-vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona oštećenih u potresu. Radovi na sanaciji klizišta Hršak Breg na ŽC2155 sufinancirani su od strane Hrvatskih voda.


2.1.1.1. Radovi na sanaciji klizišta Gorjani Sutinski LC22089



2.1.1.2. Radovi na sanaciji klizišta Putkovec ŽC2096

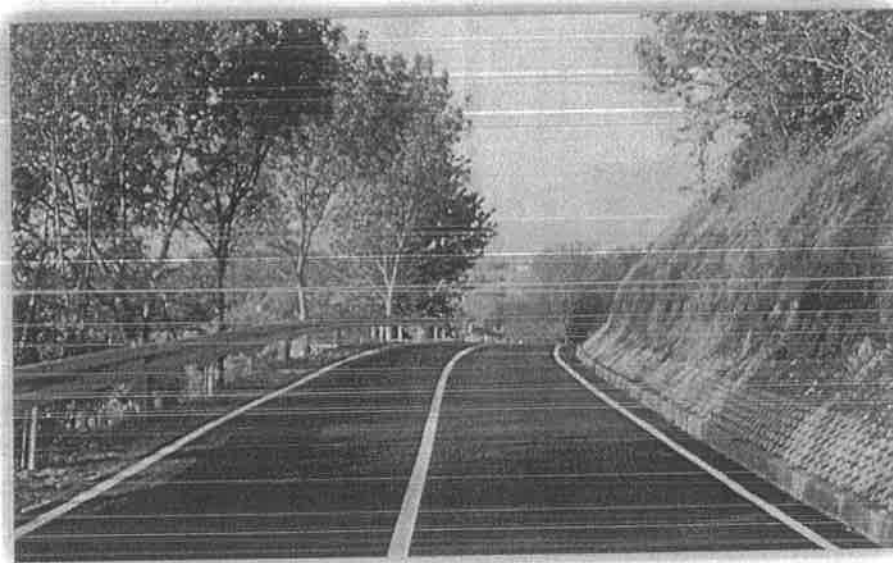

2.1.1.3. Radovi na sanaciji klizišta Sopot ŽC2151

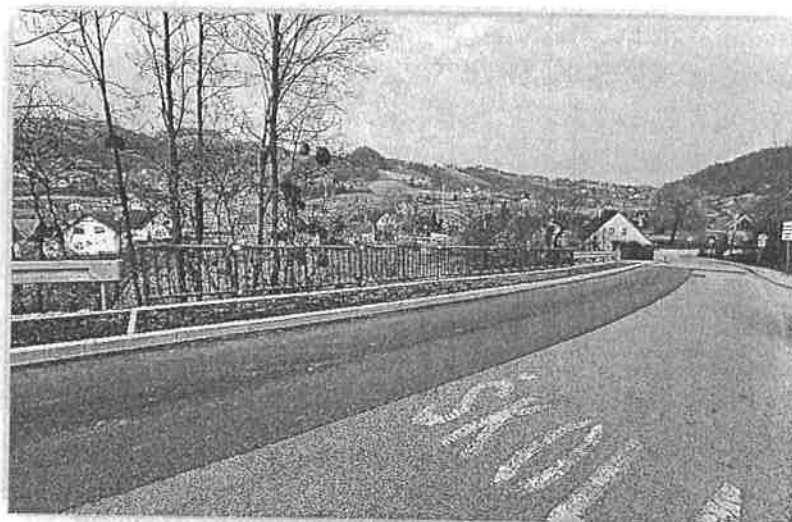

2.1.1.4. Radovi na sanaciji klizišta Hršak Breg ŽC2155



2.1.1.5. Radovi na sanaciji klizišta Globočec-Kožići ŽC2221




2.1.1.6. Radovi na sanaciji klizišta Orešje Humsko LC22008




2.2.1. Radovi na rekonstrukciji/izgradnji cesta; navedeni u tablici 16., planirani su ukupnom iznosu od 593.225,00 EUR, a realizirani su u iznosu od 531.987,28 EUR. Radovi na zahvatu izgradnje kružnog raskrižja i rekonstrukcije ceste Radoboj na Ž2122 ugovoreni su tijekom 2023. godine s rokom završetka radova 30.03.2024. godine. Ostali zahvati realizirani su tijekom 2023. godine.


2.2.1.1. Radovi na rekonstrukciji ceste Lobar-Buntaki ŽC2128

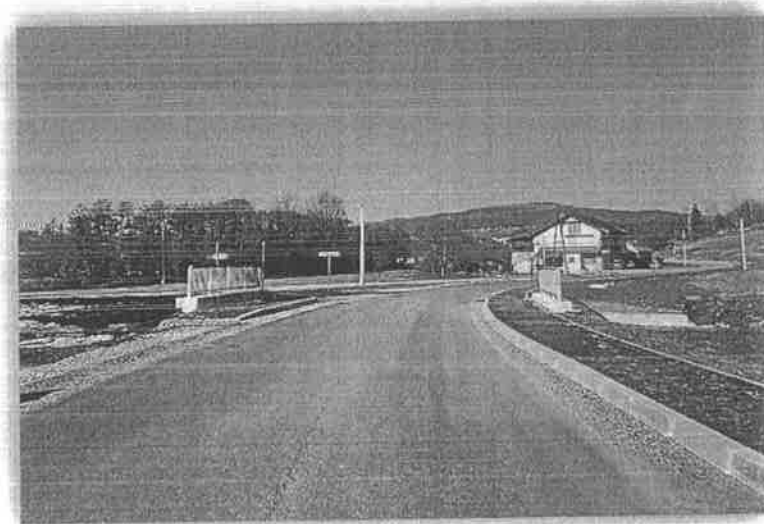

2.2.1.2. Radovi na Izgradnja kružnog raskrižja i rekonstrukcija ceste Radoboj ŽC2122

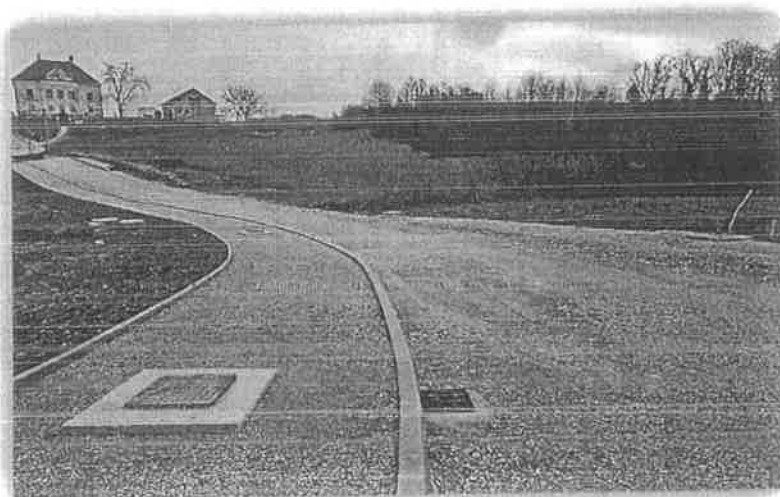

2.2.1.3. Radovi na rekonstrukciji ceste Krapinske Toplice ŽC2155

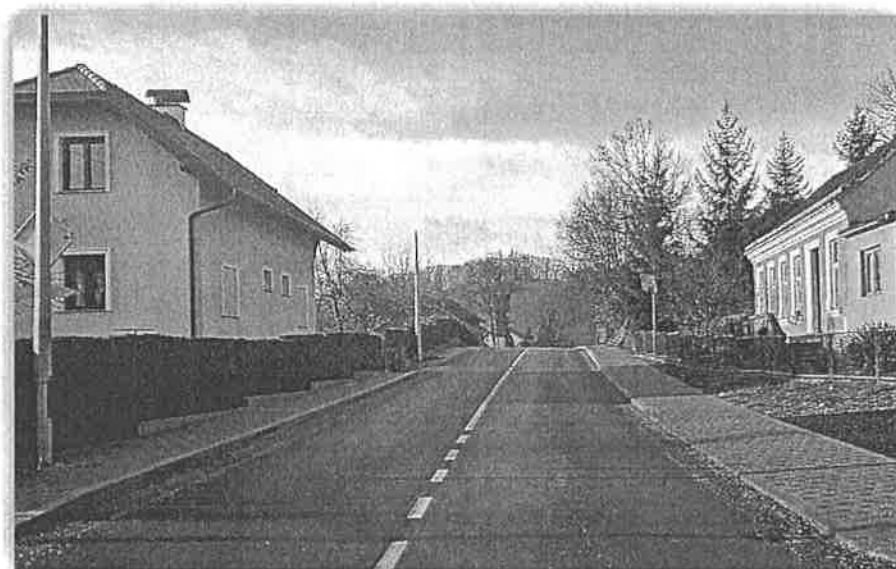

2.3.1. Radovi na rekonstrukciji/sanaciji propusta i mostova; navedeni u tablici 18., planirani su ukupnom iznosu od 1.621.210,37 EUR, a realizirani su u iznosu od 1.286.210,40 EUR. Radovi na zahvatu izgradnje mosta Donja Stubica-Jezerčica na L22106 ugovoreni su tijekom 2023. godine s rokom realizacije u prvoj polovici 2024. godine. Ostali zahvati realizirani su tijekom 2023. godine te su sufinancirani iz Fonda solidarnosti Europske unije - vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona oštećenih u potresu. Sufinanciranje je izvršeno u omjeru 80% FSEU te 20% ŽUC.

2.3.1.1. Radovi na sanaciji propusta Selnica LC22078



2.3.1.2. Radovi na sanaciji mosta Donja Stubica ŽC2200



2.3.1.3. Radovi na sanaciji propusta Velika Petrovogorska ŽC2126



2.3.1.4. Radovi na sanaciji propusta Šimunci ŽC2248

